



شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى
احدى الشركات التابعة
للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي



موقف المشروعات
الجارى تنفيذها بمعرفة
الجهاز التنفيذى


الجبل الأصفر

البركة

بلقس

عرب ابو ساعد

زامات محطات المعالجة

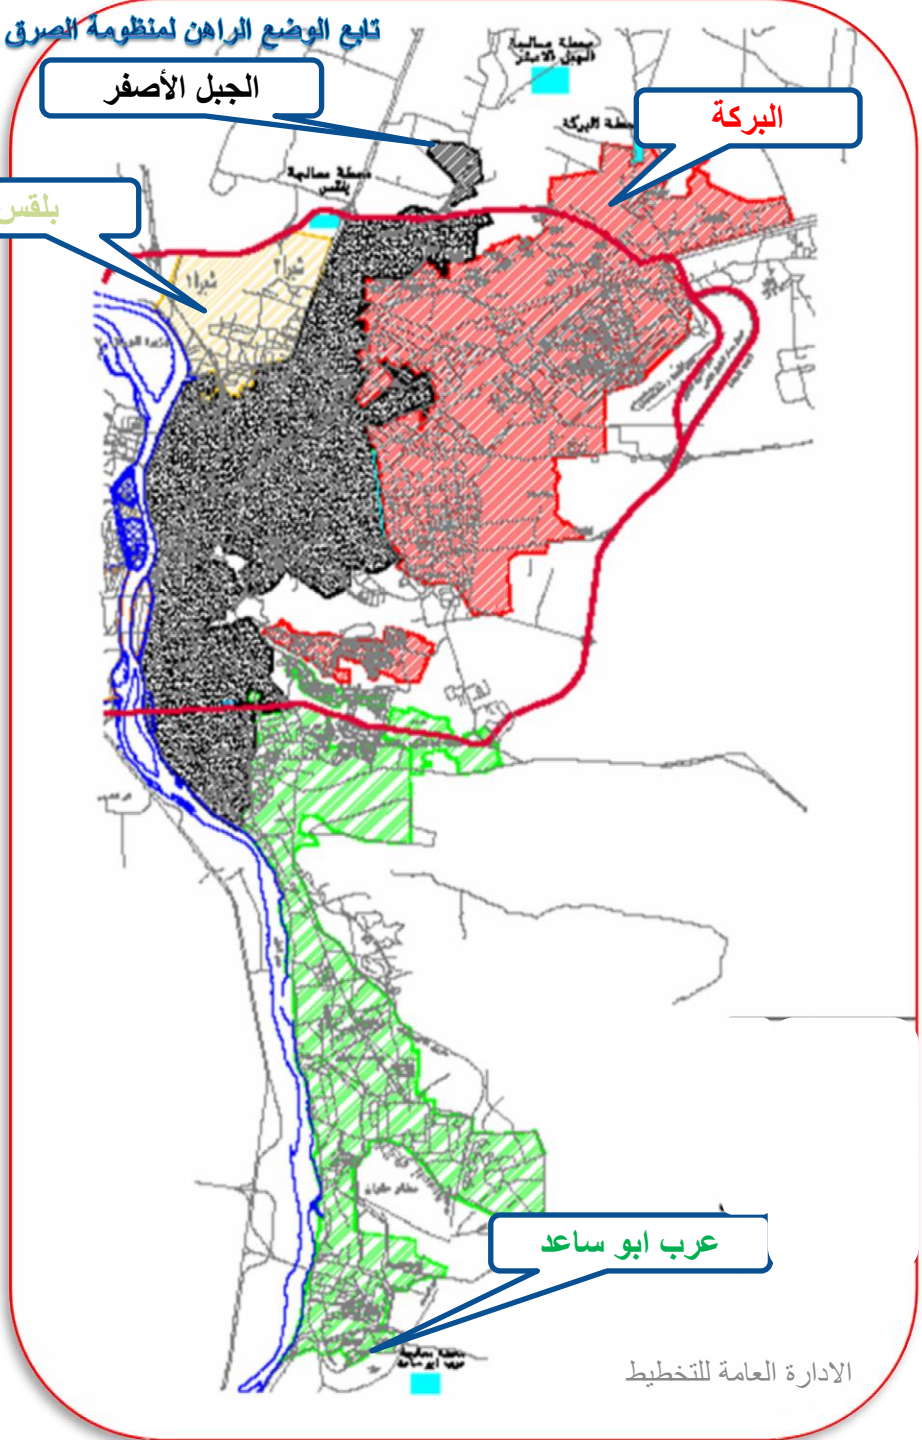


اولا : شرق النيل

توسعات محطة الأميرية

الشركة المنفذة	: شركة المقاولون العرب تحت إشراف الجهاز
الهدف من المشروع	: رفع طاقة المحطة من ٢ مليون م٣ / يوم إلى ٣.٥ مليون م٣ / يوم لخدمة مناطق شرق النيل بدءاً من دار السلام والمعادي حتى الأميرية
تاريخ النهو	: ١/١٢/٢٠١٥
قيمه المشروع	: ٤٢٩ مليون جنيه
نسبة الإنجاز	: الأعمال الكهروميكانيكية ٩٥ % الأعمال المدنية ٨٥ %
مكونات المشروع	: إنشاء عنبر جديد قطر ٤٠ م بعمق ٣٥ م وعدد (٦) ظلمبات تصرف الواحدة ٣.٦ م٣ / ث بإجمالي تصرفات ١.٥ مليون م٣ / يوم



LAYOUT PLAN FOR THE LOCATION OF THE PROJECT AT AMERIA

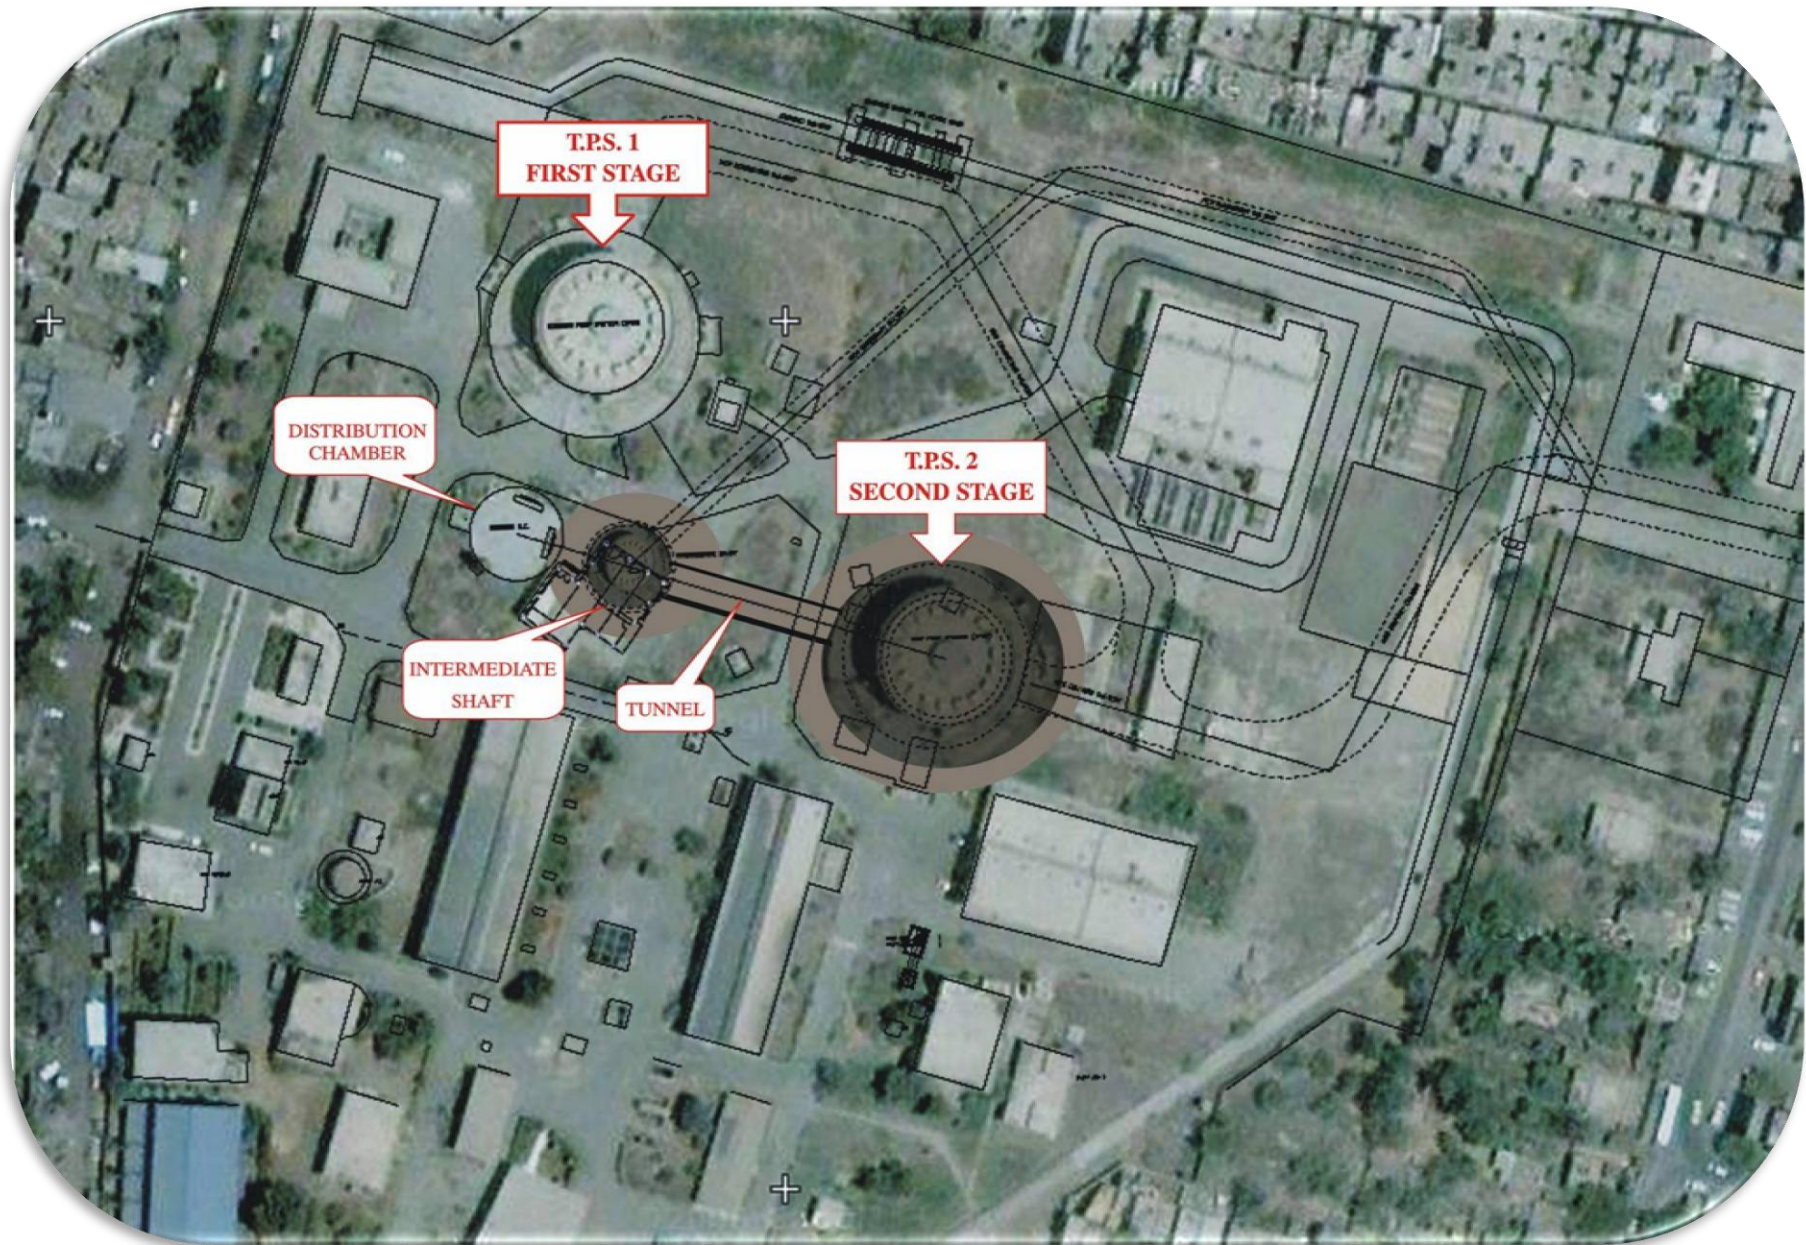


LAYOUT PLAN FOR THE NEW PROJECT STAGE




TPS



MODIFIED STRUCTURAL SYSTEM AND REQUIRED MODIFICATION THE PUMP STATION DIMENSIONS

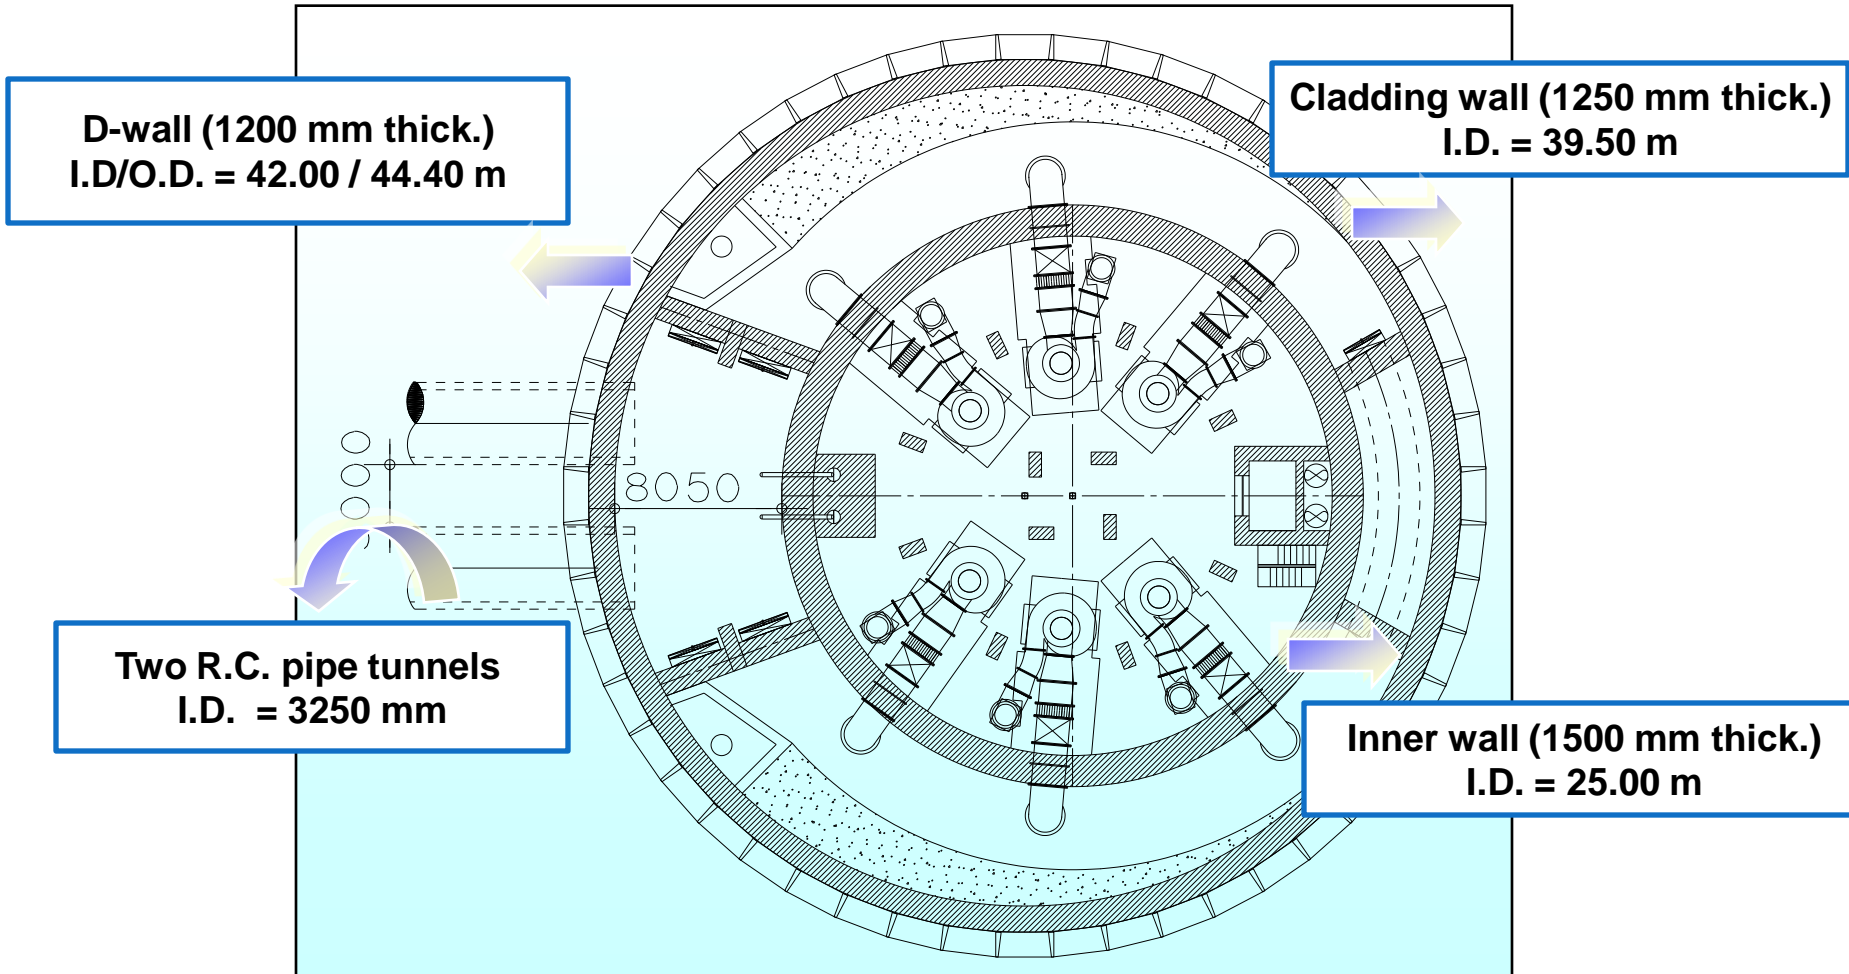

TPS2- PUMPS LEVEL PLAN
ELV. (-6.65)

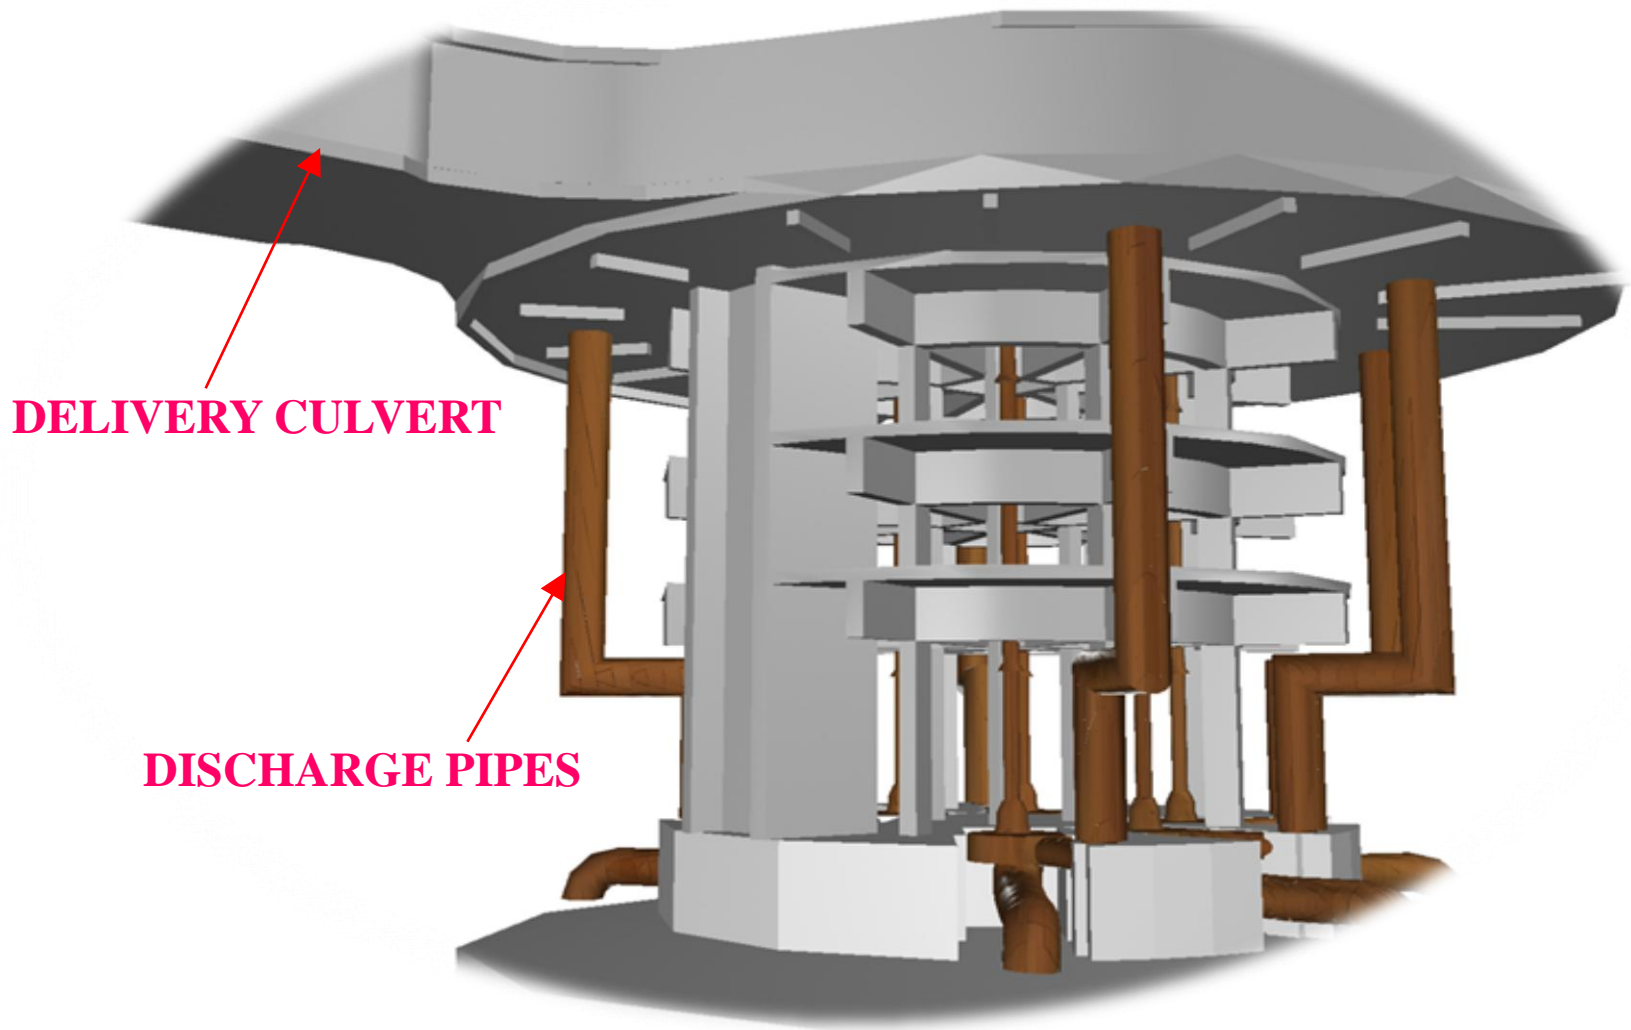

ISOMETRIC VIEW SHOWING THE MECHANICAL COMPONENTS AND
STRUCTURAL ELEMENTS




2014/11/12 12:36

خطوط الأنفاق من محطة الأميرية وحتى البربخ الرئيسي غرفة الإتصال رقم

١

الشركة المنفذة	: شركة كوتكورد للهندسة والمقاولات
الهدف من المشروع	: إزدواج للخطوط الناقلة للمياه من محطة الأميرية إلى محطة المعالجة بالجبل الأصفر
تاريخ النهو	: ١٤/١١/٢٠١٥
قيمه المشروع	: ٣٦٣ مليون جنيه
نسبة الإنجاز	: <ul style="list-style-type: none">• بنسبة ٥٥ %• تم تنفيذ ٤.٧٥ كم مواسير قطر ٢.٧٥ م• تم تنفيذ عدد (١٧) غرفة
مكونات المشروع	: عدد (٣) خطوط قطر كل خط ٢.٧٥ م بطول ٣ كم بإجمالى ٩ كم وعدد الغرف ٢٤ غرفة بالأنفاق

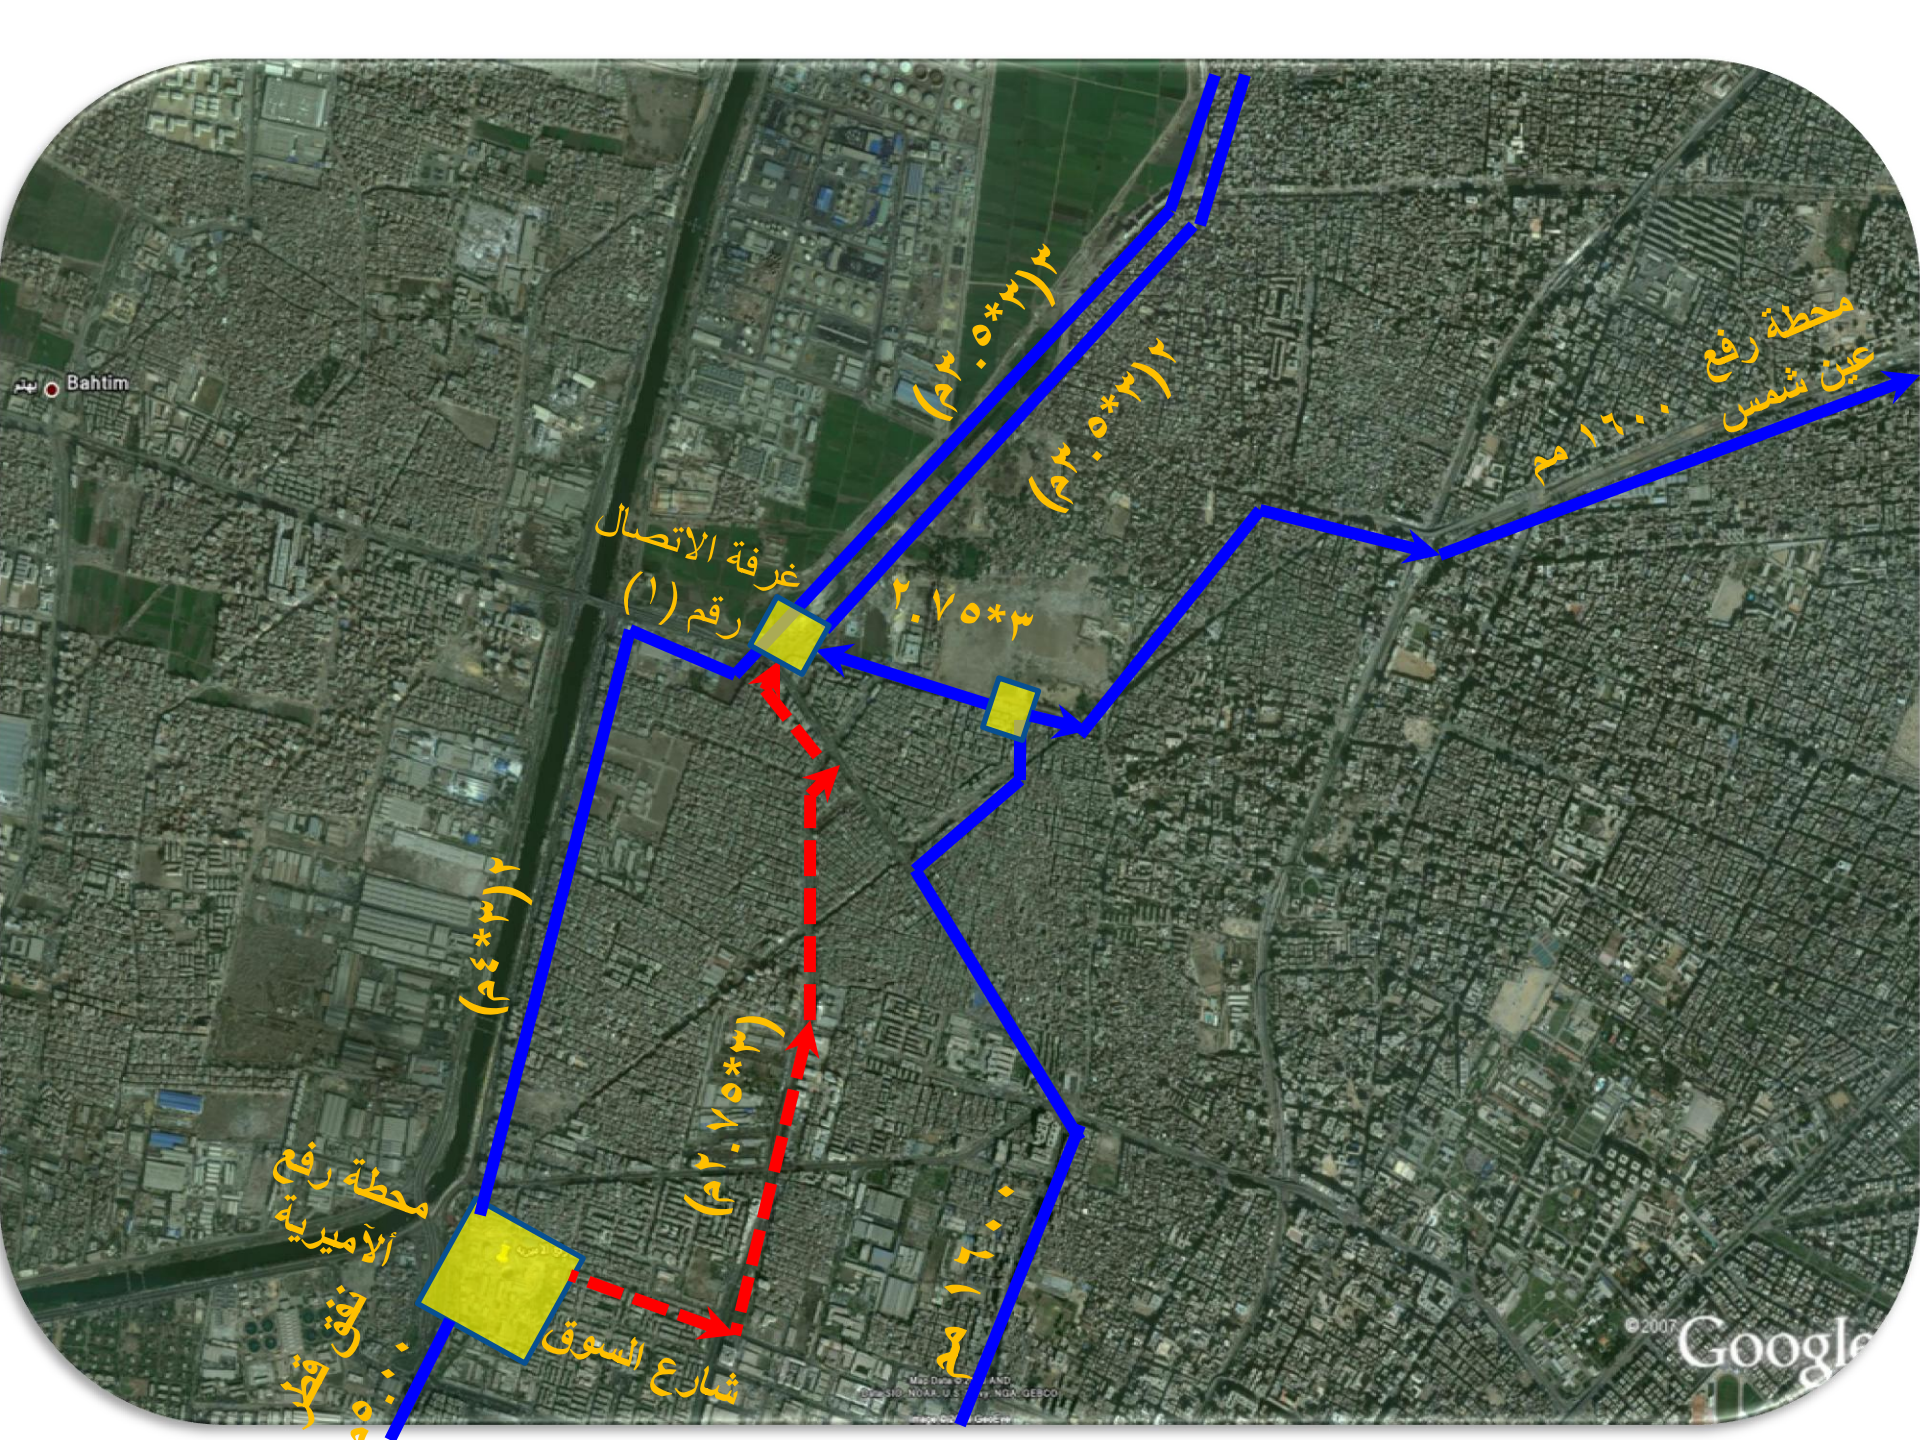

Bahtim

محطة رفع
عين شمس

1600 م

غرفة الاتصال
رقم (1)

2.75*3 م

2.75*3 م

2.75*3 م

2.75*3 م

2.75*3 م

2.75*3 م

محطة رفع
الأميرية

تحتي فخر

شارع السوق

© 2007 Google

Map Data © 2007 AND
© 2007 NOKIA - U.S. & CANADA
© 2007 NAVTEQ, GEBCO

إزدواج المجمعات الرئيسية (المرحلة الثانية لمشروع شرق النيل)

الشركة المنفذة : شركة المقاولون العرب تحت إشراف الجهاز

الهدف من المشروع : تنفيذ إزدواج للخطوط والمجمعات الرئيسية الناقلة للمياه من محطة الأميرية ثم إلى محطة الخصوص الحلزونية ثم إلى القلج الحلزونية ثم إلى الجبل الأصفر لإستيعاب الزيادة من التصرفات الواردة لمحطة الأميرية .

تاريخ النهو : ٣٠/٦/٢٠١٧

قيمه المشروع : ٢٩٩ مليون جنيه

نسبة الإنجاز : ٨٥ %

١- **برابخ من غرفة الإتصال (١) إلى الخصوص الحلزونية :**


• بطول ٢.٣ كم وبعدد (٣) عين [٣.٥ × ٣.٠ كم] بقيمة ١٠٠ مليون جنيه

• وتم نهو المشروع ماعدا ٧٠٠ م/ط يتم تنفيذه بالدفع النفقى بقيمة ٨٥ مليون جنيه ومنتظر نهوه فى ٣٠/٦/٢٠١٧

مكونات المشروع :

٢- **برابخ من محطة الخصوص الحلزونية إلى الجبل الاصفر:**

• بطول ٨.٠٠ كم وبعدد (٣) عين [٣.٥ × ٣.٠ كم] وتم الاستلام والتشغيل

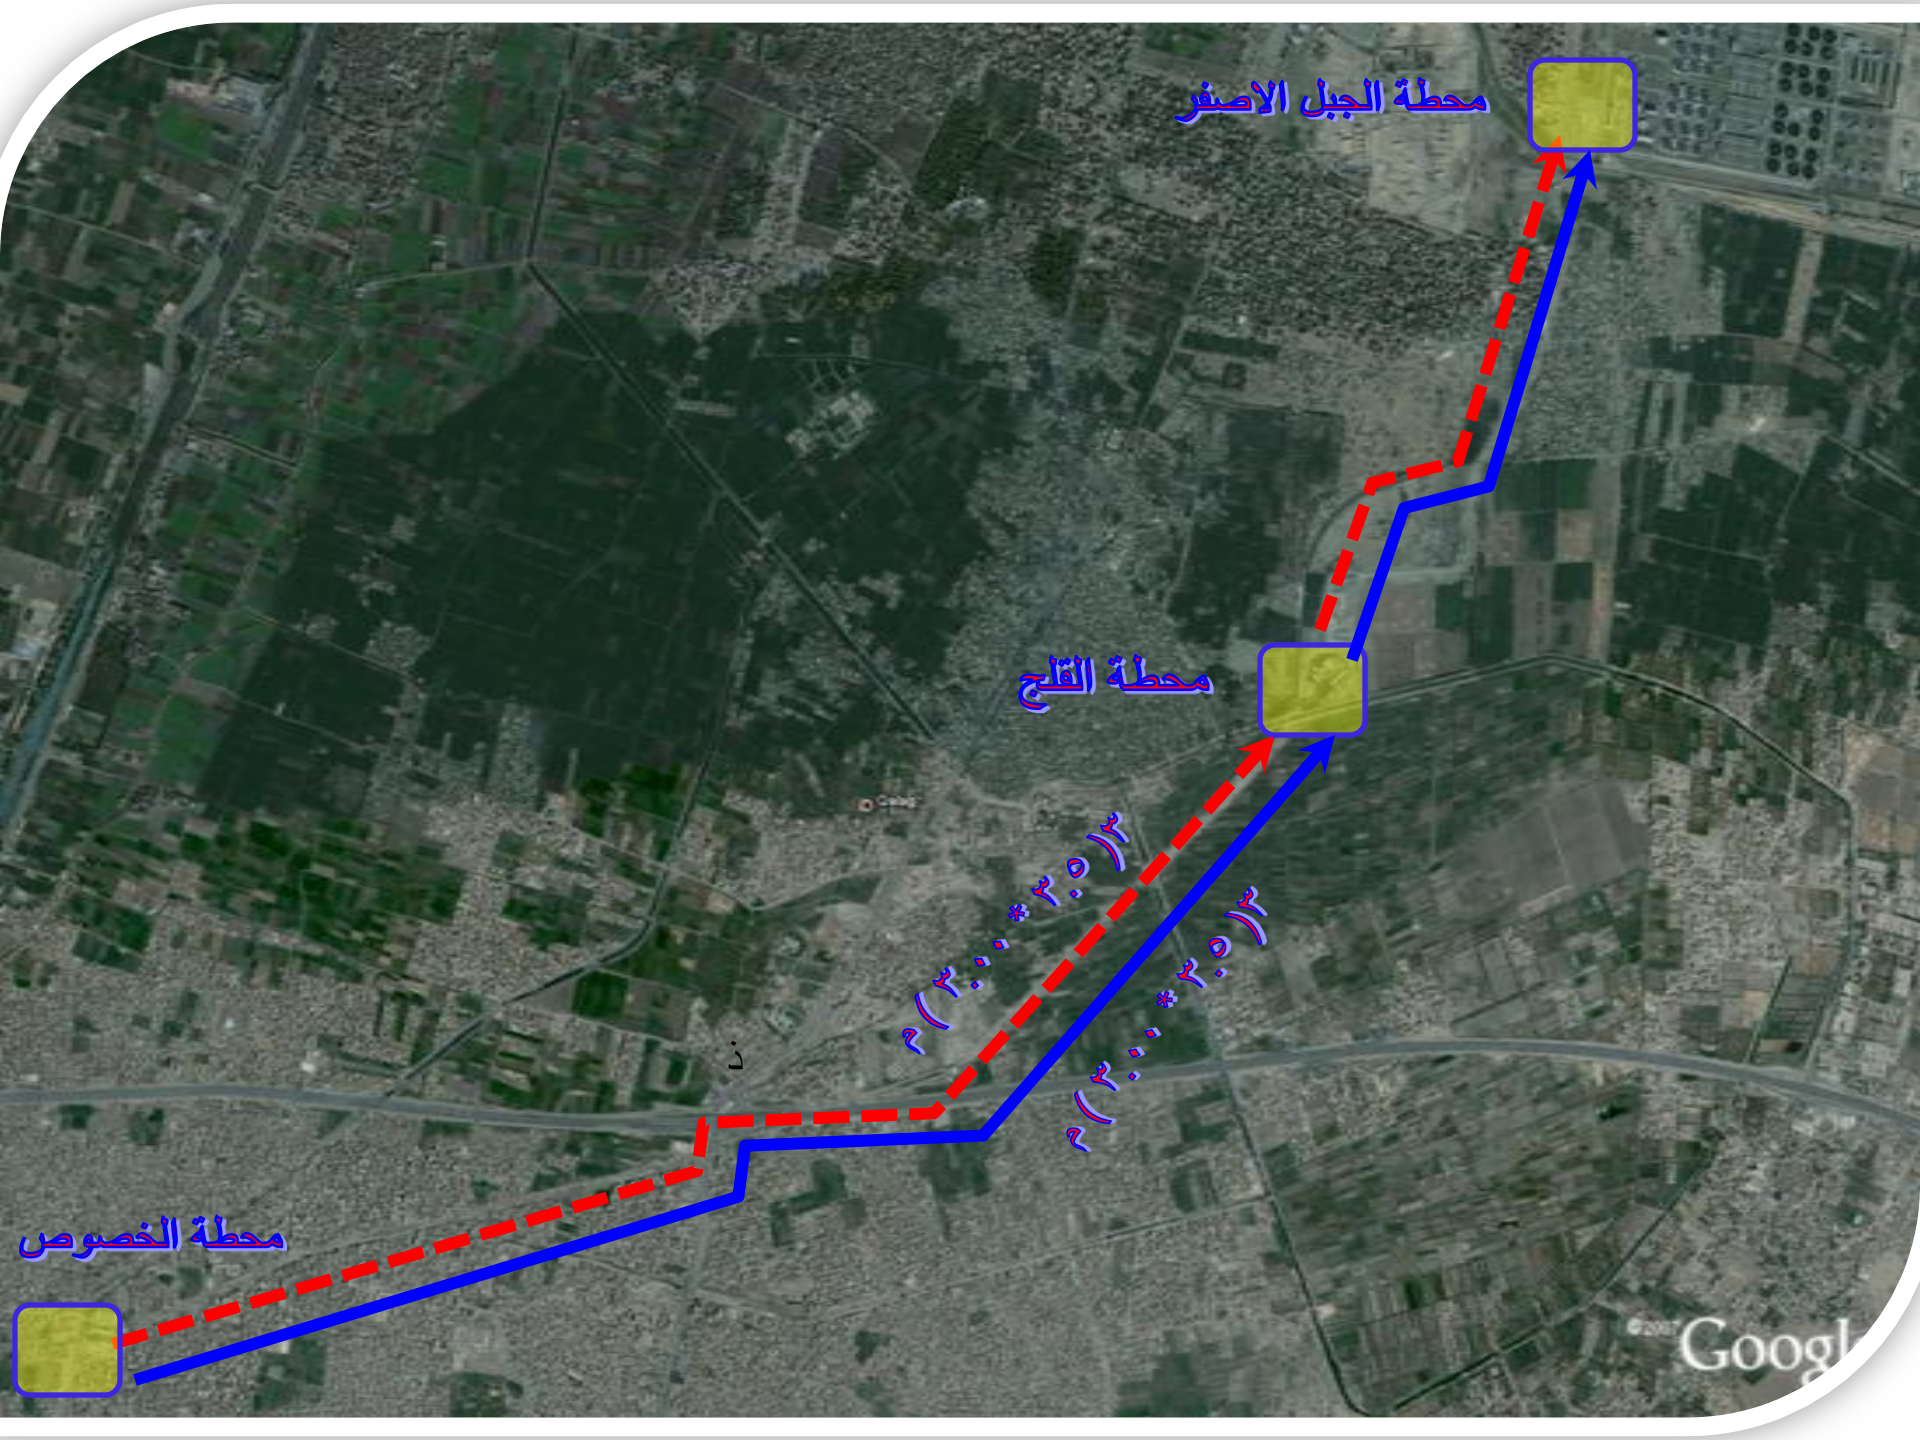

محطة الجبل الاصفر

محطة القلج

محطة الخصوص

٣ (٣٠٠ * ٣٠٠) م
٣ (٣٠٠ * ٣٠٠) م





2010

توسعات محطة معالجة الجبل الأصفر

الشركة المنفذة	: شركة أكسيونا مع شركة أبناء حسن علام
الهدف من المشروع	: رفع طاقة المحطة من ٢ مليون م٣/يوم إلى ٢.٥ مليون م٣/يوم
تاريخ النهو	: ٣٠/٦/٢٠١٧
قيمه المشروع	: ٥٠٠ مليون يورو للمهمات الميكانيكية والكهربائية + ٥٠٠ مليون جنيه مصرى للأعمال المدنية
نسبة الإنجاز	: ٨٥ %
مكونات المشروع	: إنشاء محطة معالجة بطاقة إستيعابية ٥٠٠ ألف م٣/يوم لزيادة طاقة المحطة من ٢.٠ مليون إلى ٢.٥ مليون م٣/يوم .

توسعات أعمال المعالجة بشرق النيل

امتداد
عقد ١٦
٣٠٠ الف
م/٣/يوم

امتداد
عقد ١٩
٥٠٠ الف
م/٣/يوم

عقد ١٩
٥٠٠ الف
م/٣/يوم

معالجة
حماة

١.٢ مليون م/٣/يوم
عقد ١٦

٢.٥ م من العبور

$2.5 + 1800 \times 3$

$2.5 + 1800 \times 3$

معالجة
البركة
٦٠٠ الف
م/٣/يوم

نفق شرق النيل

© ٢٠١٢ ORION-ME
Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO
Image © ٢٠١٢ GeoEye

م شرقا ٣٥٧٢٣٥.٢٣ م شمالا ٤٤٦٨١١.٢٢

١٠٠% التقى
الإدارة العامة للتخطيط

إتمام المشروع والتقييم















عملية إنشاء سحارة مصرف بلبيس الجديدة أسفل ترعة الإسماعيلية

الشركة المنفذة	: شركة المقاولون العرب تحت إشراف الجهاز
الهدف من المشروع	: نقل التصرفات المياه المعالجة من الجبل الأصفر والبركة إلى مصرف بلبيس
مكونات المشروع	: عدد ٥ مواسير بنظام الانفاق أسفل ترعه الاسماعيليه بطول ٢٢٥ متر للخط الواحد لنقل تصرفات مصرف بلبيس باجمالى ٤ مليون م ^٣ /يوم بدلا من السحاره القديمه لسوء حالتها
قيمه المشروع	: ٩٨ مليون جنيه
تاريخ البدء	: ٢٠/١١/٢٠١٢
تاريخ النهو	: ١٨ شهر
نسبة الإنجاز	: ١٥ %



مصرف بلبيس

عدد 5 انفاق 3.25م

ترعة الاسماعيلية

مصرف بلبيس


كفر عيان

ابوزعل
Google

© 2015 ORION-ME
© 2015 Google
Image © 2015 DigitalGlobe

تحسين صرف مشروع سليم مرحلة ثانية

الشركة المنفذة	: شركة إم سى إنترناشيونال
الهدف من المشروع	: نقل التصرفات المياه المعالجة من الجبل الأصفر والبركة إلى مصرف بلبيس
تاريخ البدء	٢٠١٢/١١/٢٠
الموقف التنفيذى	: تم نهوها وتشغيلها وإلغاء محطة رفع سراى القبة القديمة للجزء الاول من المشروع . ومتبقي فرعة بطول ١٢٠ م/ط قطر ١٢٠٠ مم بشارع سليم الأول متوقفة منذ أكثر من عامين وتم سحب الأعمال من المقاول بمعرفة الجهاز وجرى حالياً إعادة الطرح لبدء التنفيذ .
قيمه المشروع	: ١٤ مليون جنيه
نسبة الإنجاز	: ٨٥ %
مكونات المشروع	: ○ الجزء الاول: مجمع قطر ١٥٠٠ مم ، ١٨٠٠ مم بأطوال ١.٢ كم بشوارع [عبد القادر الجيلانى - القصر الجمهورى - سمير الصاوى . ○ الجزء الثانى: فرعة بشارع سليم قطر ١٢٠٠ بطول ١٢٠ م/ط .

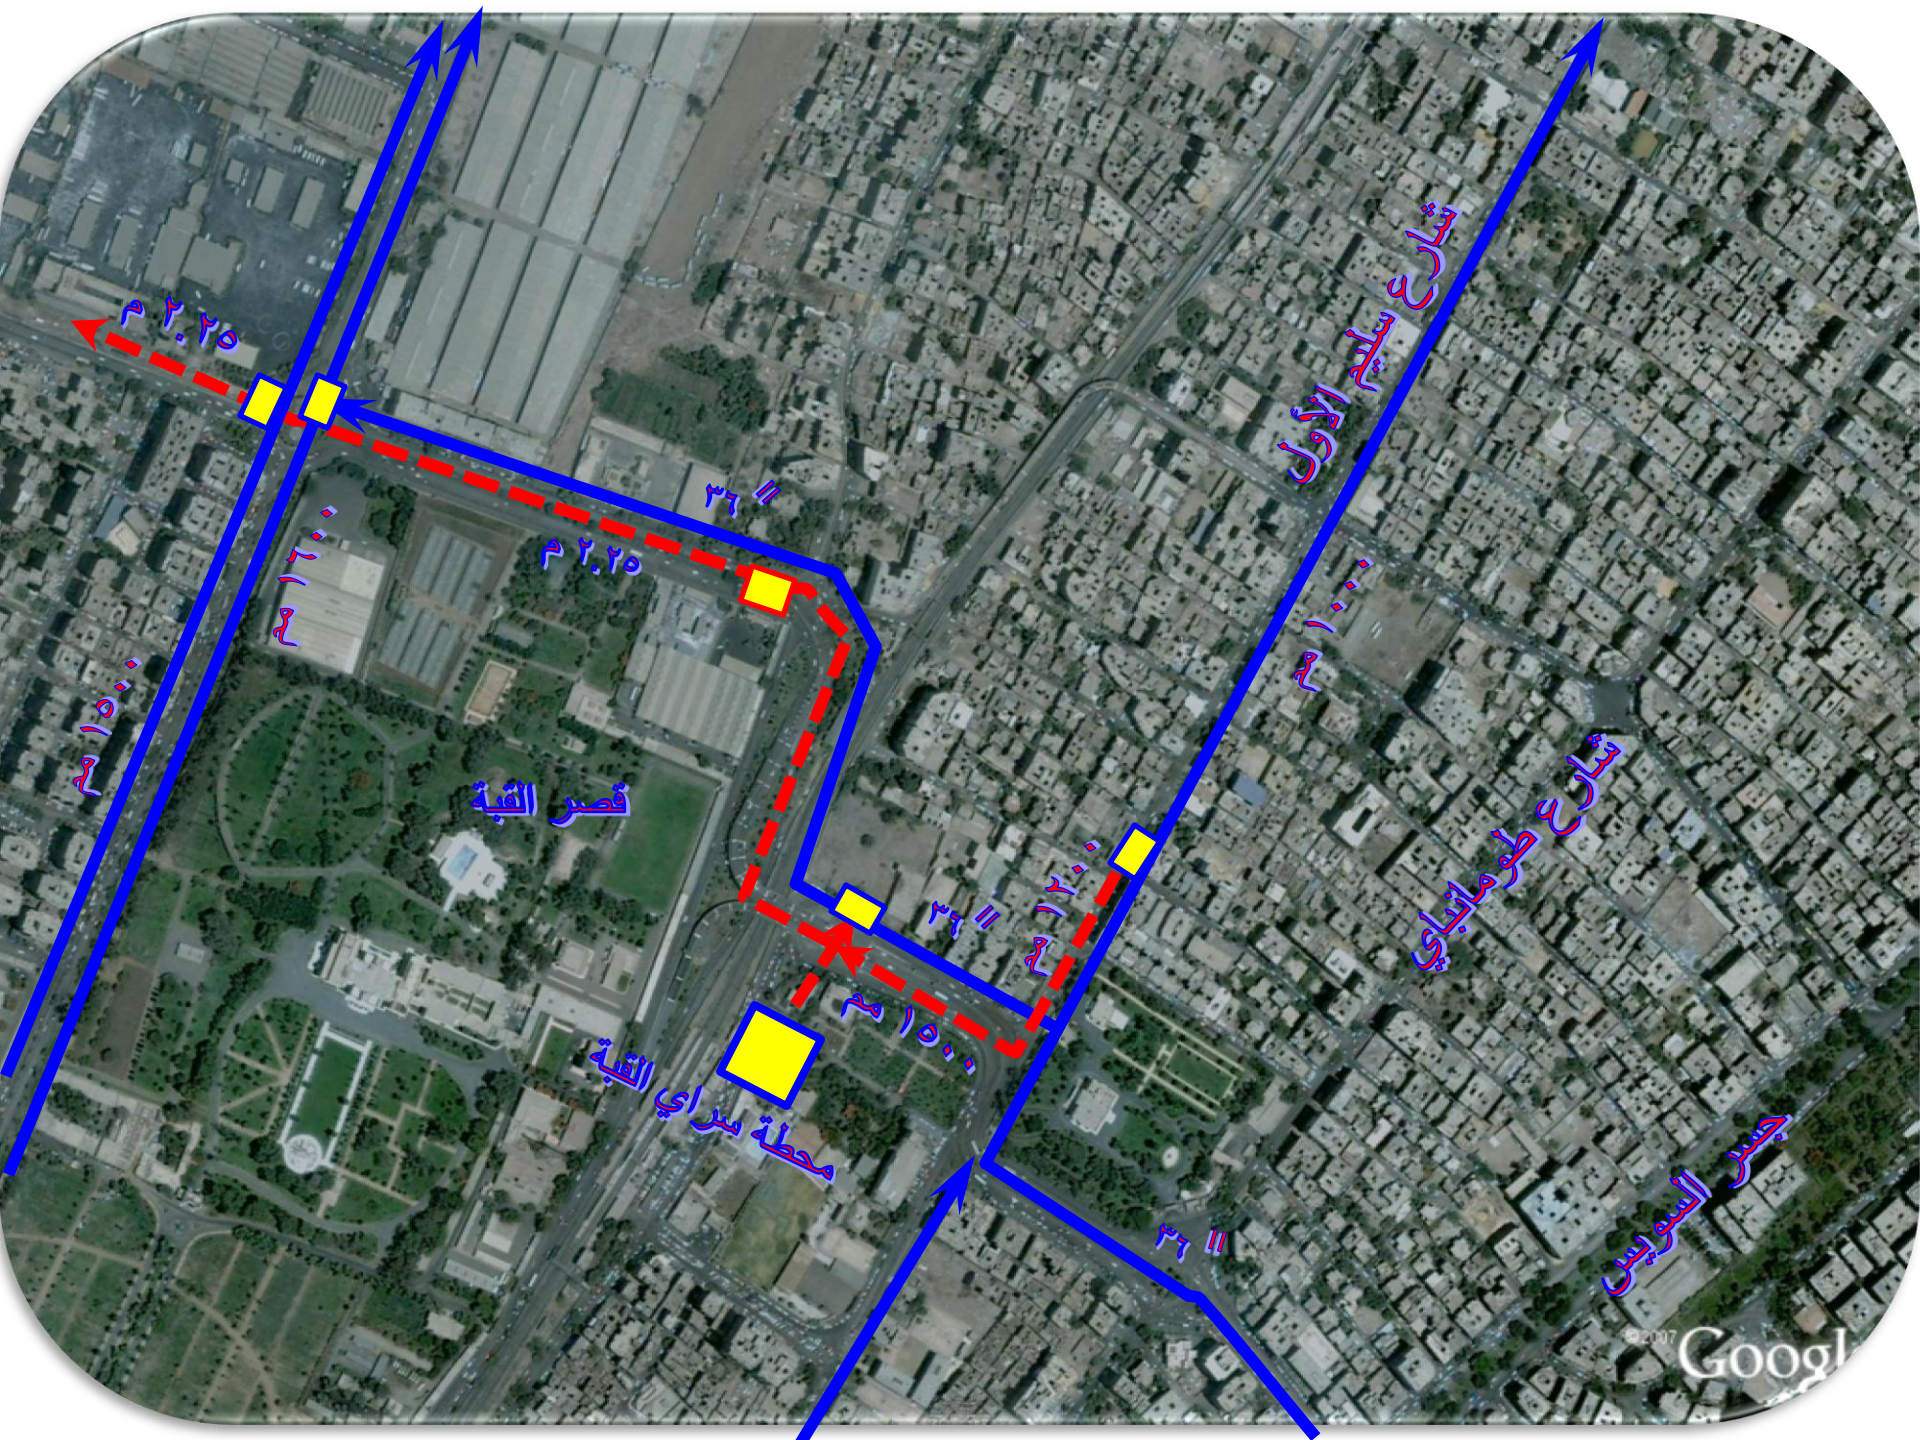

شارع سليمان الأول

شارع طر حاتباي

جسر السرييس

قصر القبة

محطة سري القبة

م ٢٠٢٥

م ٢٠٢٥

م ١٥٠٠

م ١٦٠٠

م ٣٦

م ٣٦

م ٣٦

تحسين صرف مجمع سليم الأول – مرحلة ثالثة

الشركة المنفذة	: المقاولون العرب
الهدف من المشروع	: تحسين صرف مجمع ابن الحكم ، إلغاء جزء من المجمع الأول قطر ١٦٠٠ مم المنفذ عام ١٩١٤ تحسين صرف مجمع المطراوى بحى المطرية قطر ٢٤ " لسوء حالته .
قيمه المشروع	: ١٠٠ مليون جنيه
مكونات المشروع	مجمع قطر [٤٠٠ مم ، ٨٠٠ مم ، ١٠٠٠ مم ، ١٢٠٠ مم ، ١٥٠٠ مم] بإجمالى أطوال ٤.٧ كم بشوارع ابن الحكم – سليم الأول – المطراوى حتى بربخ المطرية .
الموقف التنفيذى	: تم ترسية الجزء الأول من المشروع قطر ١٨٠٠ مم بطول حوالى ٣ كم من ميدان المطرية وحتى غرفة المصب ببربخ المطرية [ميدان المسلة] بقيمة ٣٦.٥ مليون جنيه للمقاولون العرب ولم يبدأ العمل وجرى حالياً إستخراج تصاريح الحفر .



مجمع بربخ المطرية

٦٠٠م

٢٠٢٣م

٩٠٠م

ش. عين شمس

سليم الاول ١٠٠٠م

جسر السويس

ش. عمر بن الخطاب

٦٠٠م

١٠٠٠م

ش. المطراوي

٤٠٠م

ميدان المطرية

١٢٠٠م

١٠٠٠م

ش. ابو الحكم

١٠٠٠م المصانع


٩٠٠م

١٠٠٠م

Google

تحسين الصرف الصحي لمصر الجديدة


الشركة المنفذة	: شركة المقاولون العرب
الهدف من المشروع	: إلغاء المجمع القديم المنفذ بشارع إبراهيم اللقاني والقبة عام ١٩٠٧ لسوء حالته وإنهاء عمره الافتراضي وكثرة الهبوطات به
مكونات المشروع	: خط إنحدار قطر [٦٠٠ مم ، ٨٠٠ مم ، ١٠٠٠ مم ، ١٥٠٠ مم] بأطوال ١.٩ كم بالأنفاق . ▪ المرحلة الأولى : شارع القبة حتى قصر الطاهرة - شارع إبراهيم اللقاني - شارع دمشق - شارع إبراهيم وربطه مع غرناطه . - تم بنسبة ١٠٠ % ▪ المرحلة الثانية : إستكمال شارع إبراهيم ماراً بتقاطع شارع الأهرام حتى شارع الثورة وبغداد نسبه الانجاز ٨٠ %
قيمه المشروع	: ٥٠ مليون جنية
الموقف التنفيذي	: جارى العمل بالمرحلة الثانية بطول ٤٠٠ م/ط قطر ٦٠٠ مم .
تاريخ النهو	: ١/١٢/٢٠١٥

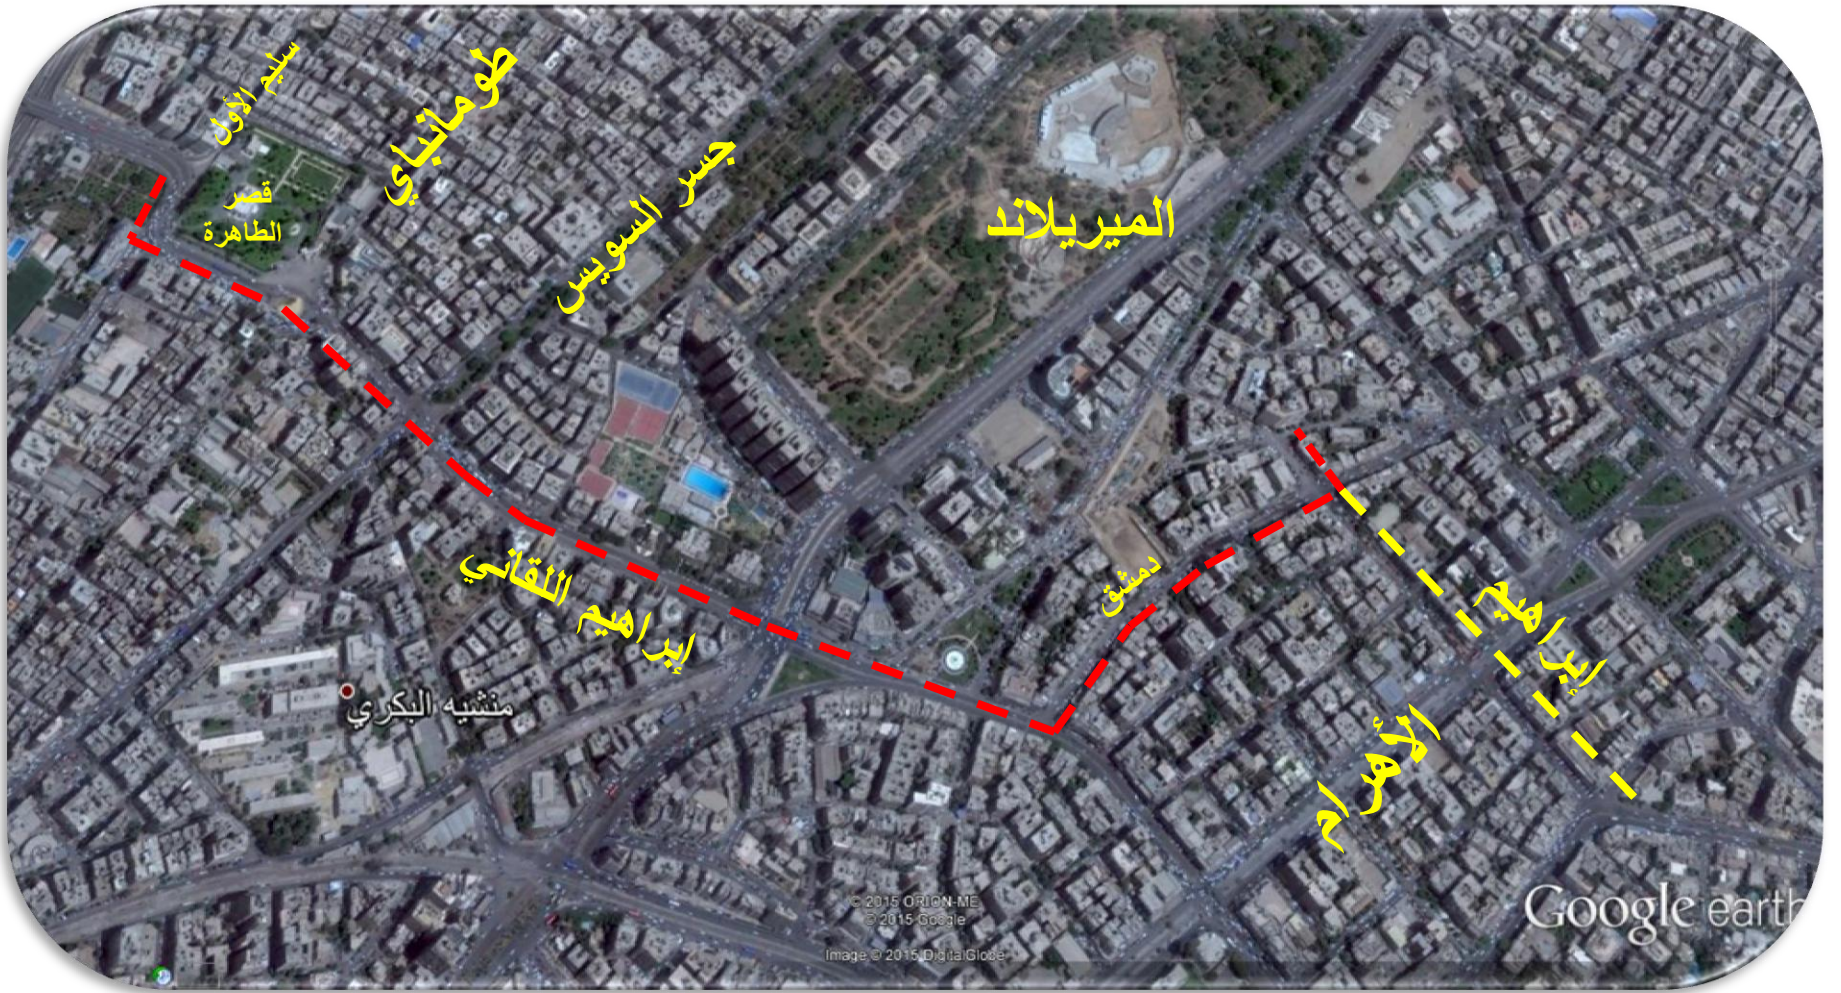

مرحلة اولي	-----
مرحلة ثانية	-----

تحسين صرف حمامات القبّة

الشركة المنفذة	: شركة كونكورد للهندسة والمقاولات
الهدف من المشروع	: تحسين صرف شوارع ابن جحدم - سكة عيش عبد الجليل - حسن كاظم - اسلام - عمر لطفي - علان - شارع محطة الزيتون - ابن سندر
مكونات المشروع	: خط إنحدار بالأنفاق قطر [٨٠٠مم ، ٩٠٠مم ، ١٠٠٠مم ١٥٠٠مم] بشارع محطة الزيتون وخطوط أقطار "١٢" ، "١٥" ، "١٨"
قيمه المشروع	: ٥٠ مليون جنيّه
الموقف التنفيذي	- تم تشغيل المرحلة الأولى في ٣٠/٤/٢٠١٤ - تم تشغيل المرحلة الثانية في ١٨/٨/٢٠١٤ - تم تشغيل المرحلة الثالثة في ٢٦/١/٢٠١٥
تاريخ النهو	: ٣٠/٦/٢٠١٥

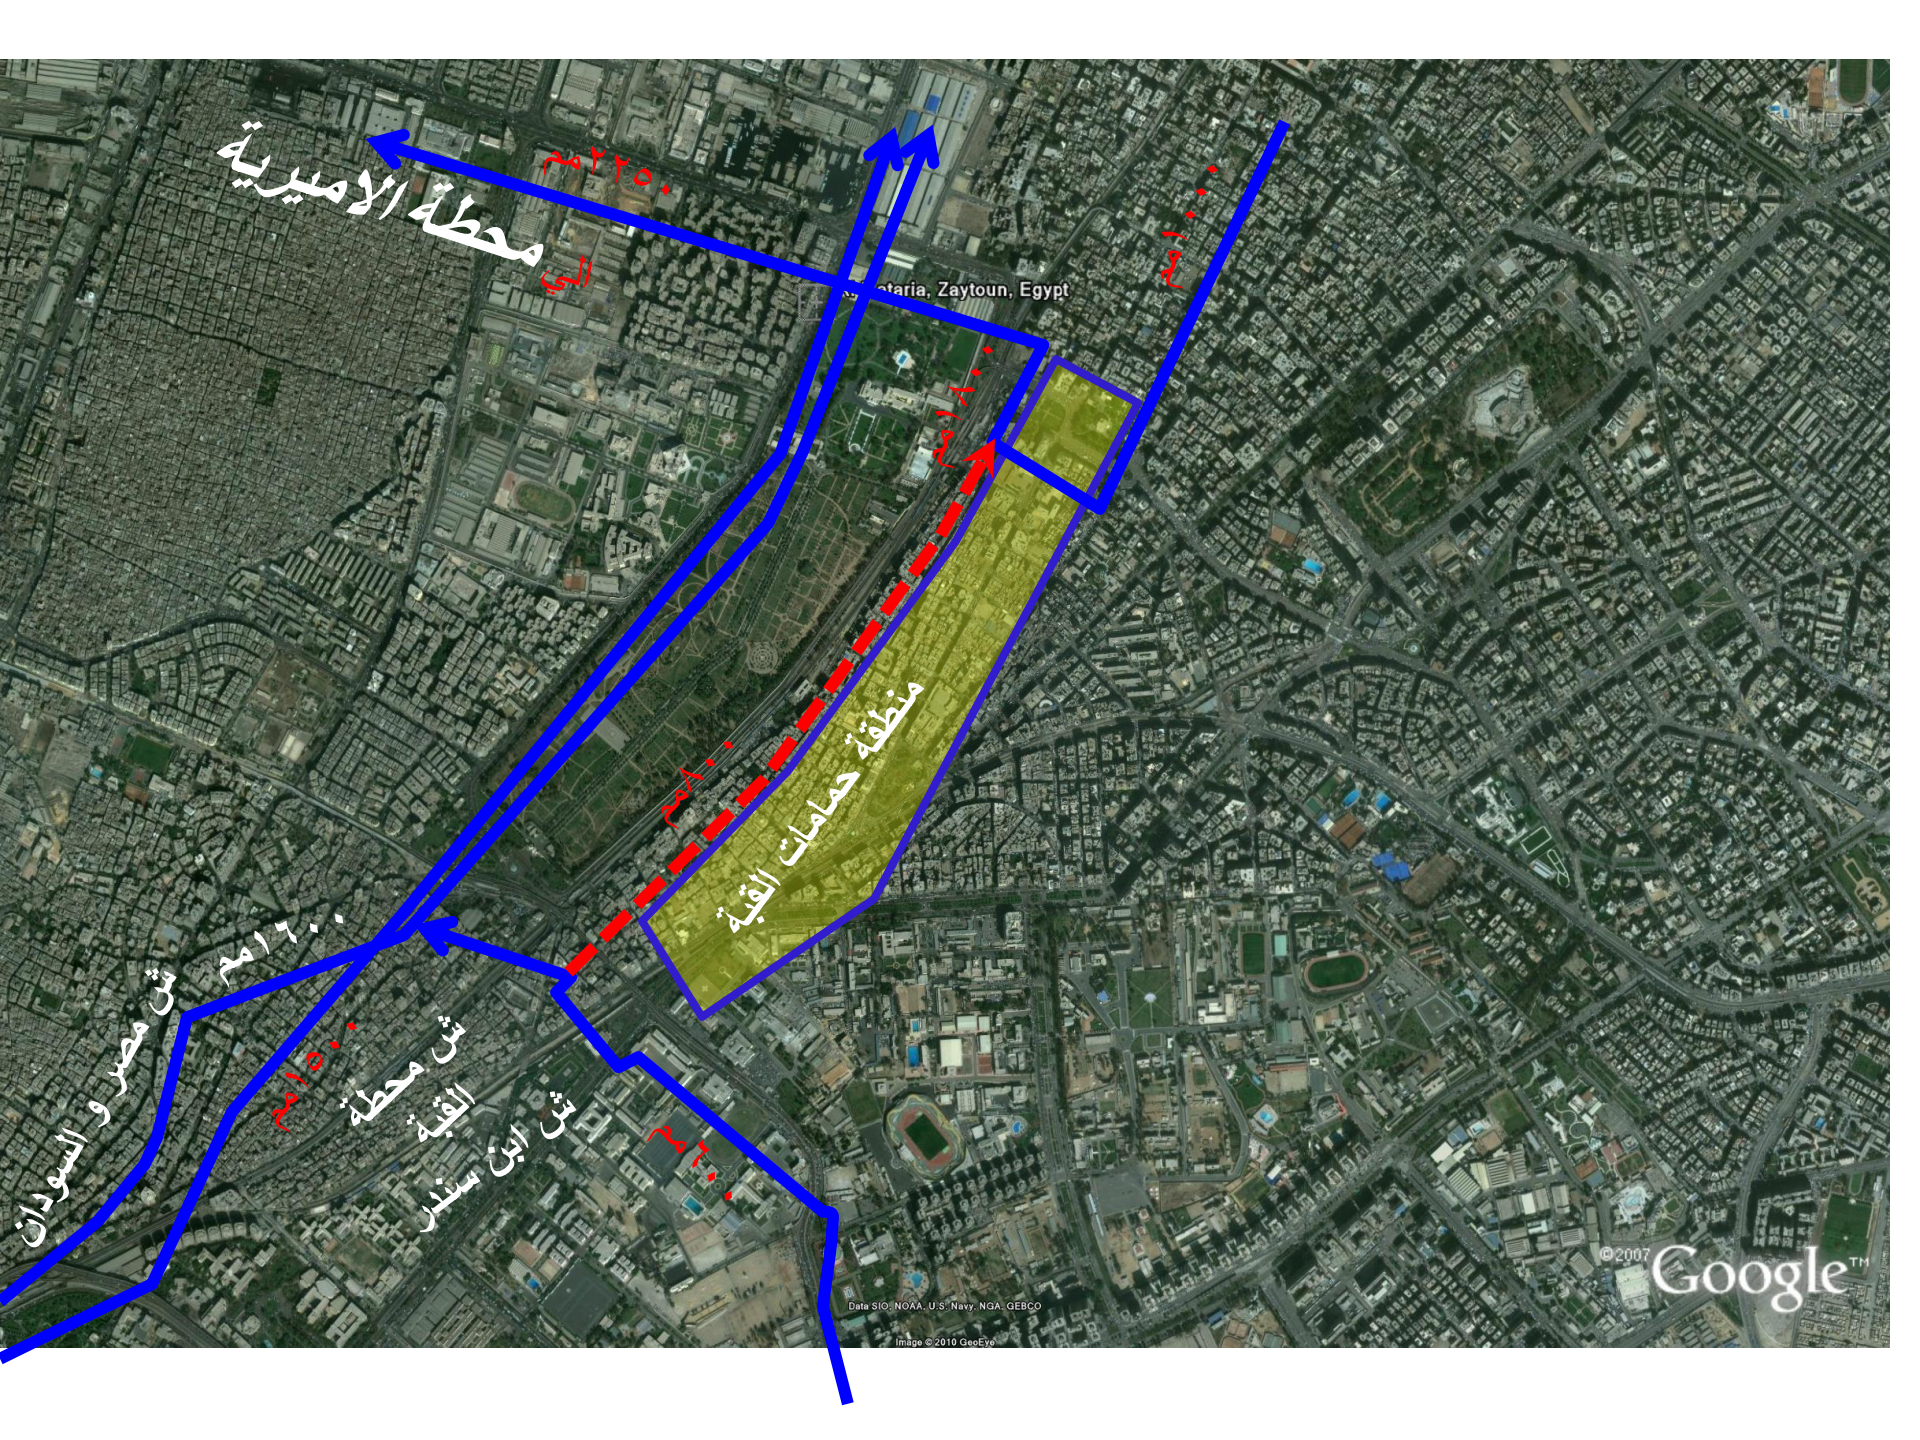

محطة الاميرية

٢٠٢٥م

منطقة حمامات القبّة

شحن مصر و السودان

شحن محطة القبّة

شحن البن سننار

شبكة الصرف الصحي للدويقة ومنشأة ناصر

الشركة المنفذة	: شركة المقاولات المصرية
الهدف من المشروع	: خدمة المناطق المحرومة وتحسين صرف للمنطقة
مكونات المشروع	: شبكات إحدار أقطار ٩" ، ١٢" ، ١٨" ، ٢٤" ٧٥٠ مم بإجمالي ١٢.٠ كم للدويقة ٥ كم لمنشأة ناصر
قيمه المشروع	: ١٨.٠٣ مليون جنيه
الموقف التنفيذي	- معدل التنفيذ لمنطقة منشأة ناصر ٨٠ % - معدل التنفيذ لمنطقة الدويقة ٩٠ %
تاريخ النهو	: ٣٠/٦/٢٠١٥



شارع الأنوستراد

عزبة بجيت

محطة الدرة

شارع سعد المصري
منطقة الثلاثات
ومنطقة الاثنيات
ومساكن احمد رزق

منشئية ناصر

شارع الحسيني
الوحايد
٢٠ بوصة
الحر فليين

شارع الطيران
مساكن سوزان مبارك

حي المرآج

مشروع أبو صير الغربى (الهدى) وعزبة الجامعة والشعاروة بكفر أبو صير الشرقى

الشركة المنفذة	: : شركة مصر للأسمنت المسلح
الهدف من المشروع	: خدمة المناطق المحرومة وتحسين الصرف للمنطقة
مكونات المشروع	: • شبكات إنحدار بأطوال ٣٥ كم أقطار من ٨" إلى ٩٠٠ مم ومحطة رفع وخط الطرد قطر ٦٠٠ مم بطول ٣١٠٠ م/ط يصرف على محطة رفع القلج الحلزونية .
قيمه المشروع	: ٦٤ مليون جنيه
الموقف التنفيذى	: • لم يتم العمل جارى مراجعة مسار خط الطرد لكثرة المرافق بإمتداد شارع مؤسسة الزكاة

عزبة الجامعة ابو حويشان كفر ابو صير الغربي

ترعة عناني

الطريق الدائري


Google earth

Imago © 2013 DigitalGlobe
© 2013 Google
© 2013 ORRÓN ME



العزبة البيضاء

الشركة المنفذة	: شركة المقاولون العرب
الهدف من المشروع	: خدمة المناطق المحرومة وتحسين صرف للمنطقة
مكونات المشروع	: شبكة إنحدار بأطوال ١٨٩.٥ كم أقطار من ٨" إلى ٩٠٠مم ومحطة رفع وخط طرد قطر ٦٠٠مم بطول ١.١٠ كم يصرف على غرفة الإتصال (٢) .
قيمه المشروع	: 50 مليون جنيه
الموقف التنفيذي	: لم يبدأ العمل

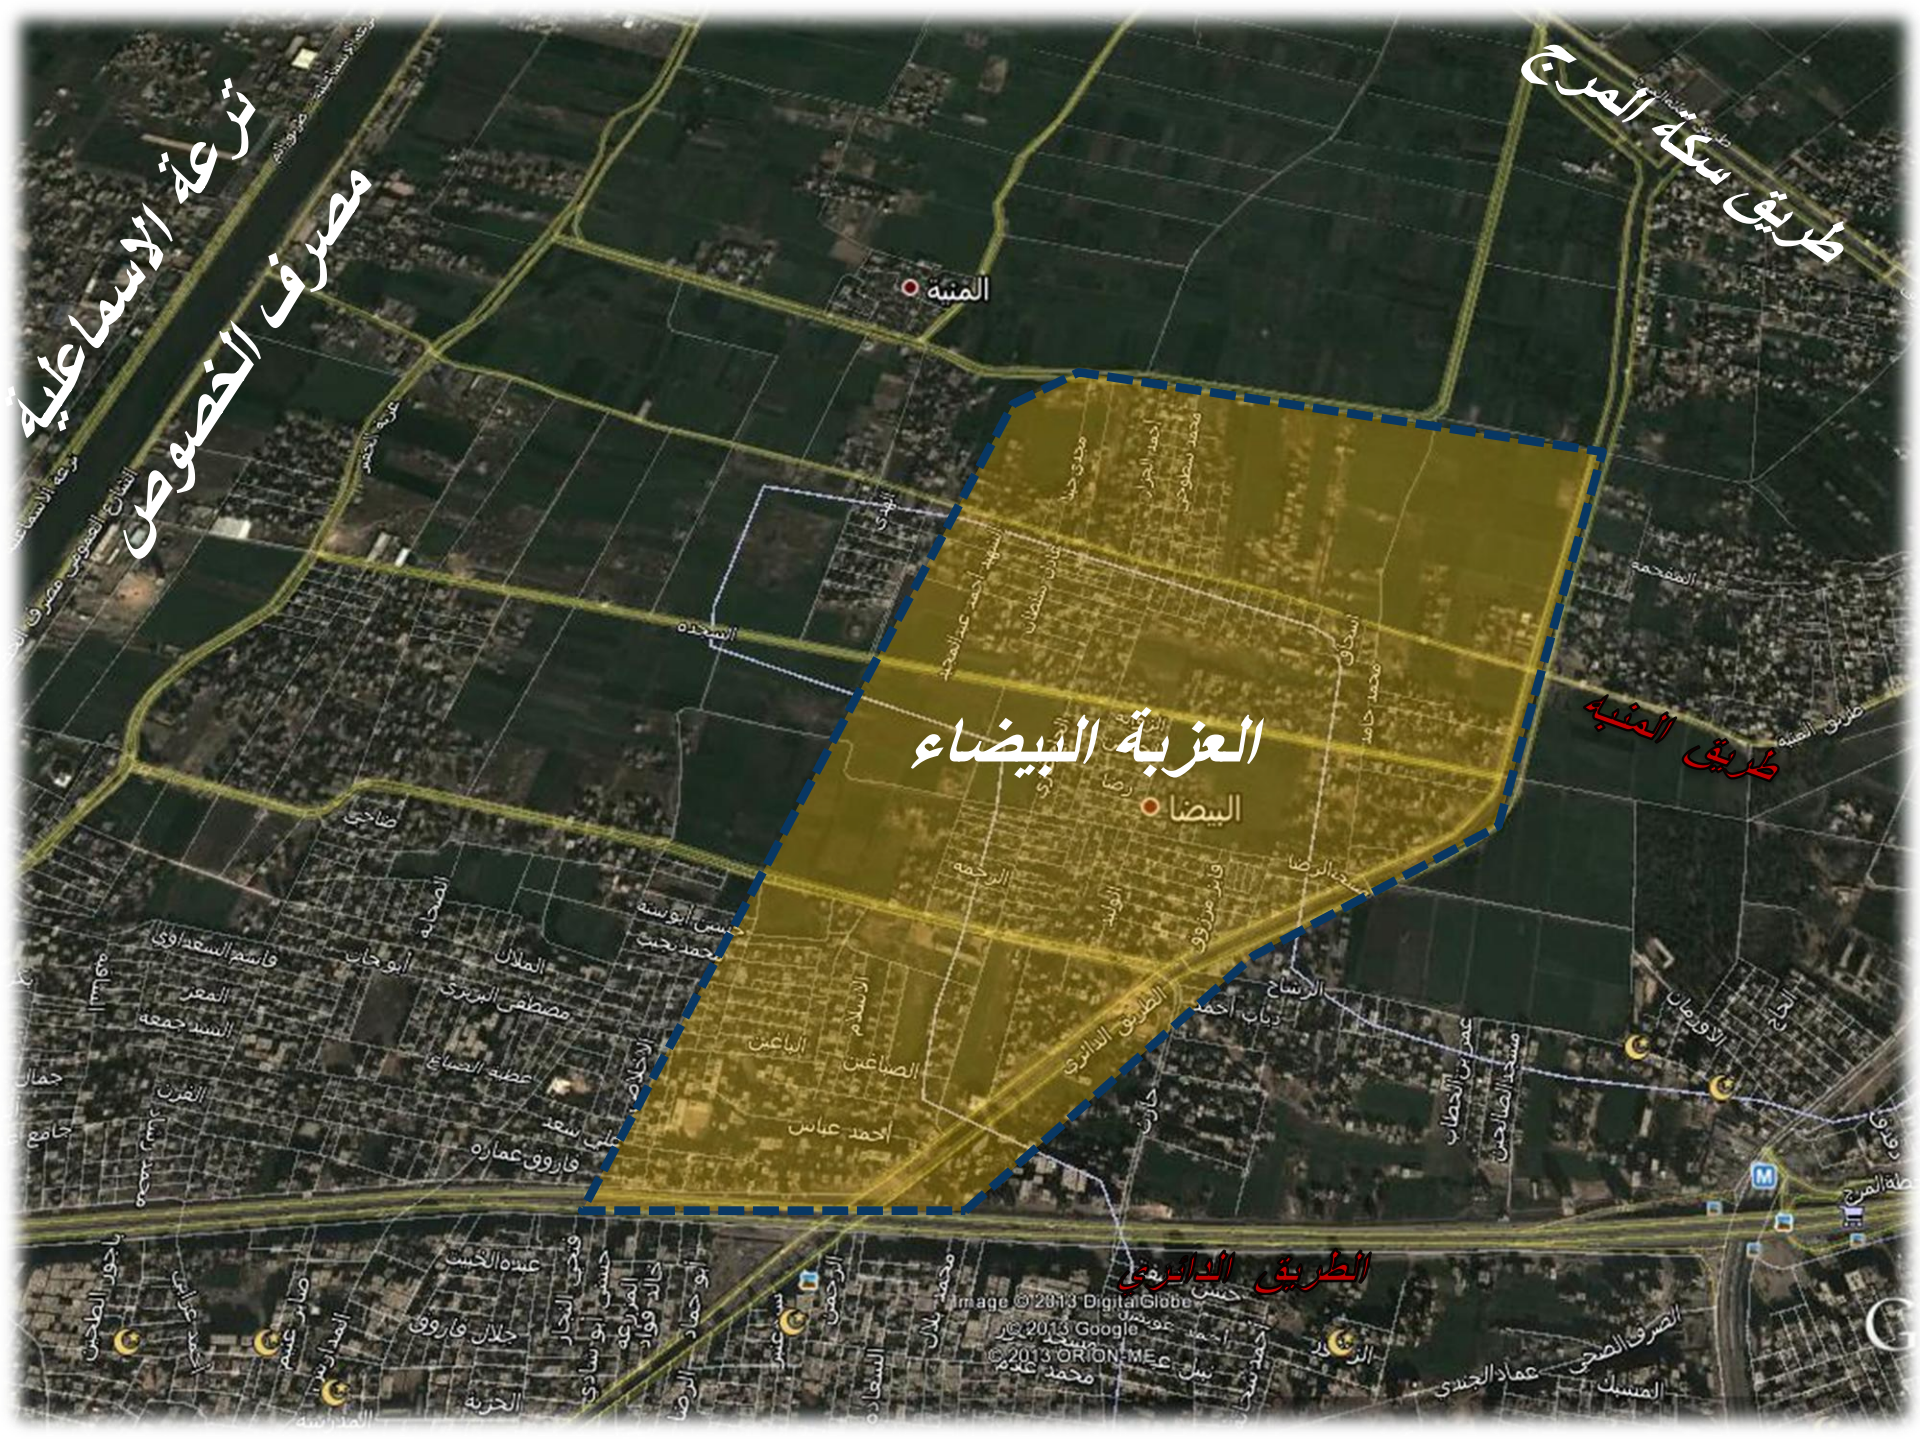

طريق سكة العرج

تدعة الإسماعيلية
مصنف الخصوص

المنية

العزبة البيضاء

البيضا

طريق المنية

الطريق الدائري

Image © 2013 DigitalGlobe
© 2013 Google
© 2013 ORION.ME
محمد عديم

الصراف الضحي
عماد الجندي
المنسك

البنان الخوصي مصروف الخ
مرفق الاسما

فانسم السعداوي
المعز
السيد جمعة
القرن
جامعة

باجور الطحن
محمد عز الدين
صاير عشم
المدار رشيد
عبد الرحمن

صناحي
الصحابه
ابو حسان
الملاي
مصطفى البربري
عطيه النصارا
علي سعد
فاروق عماره

عبد الخيت
فصحى البخار
حسني ابو سادق
المرزوقه
خالد فؤاد
ابو حماد الرضا

السجده
البيضا
الشيخه احمد عبدالمجيد
عبدان سلطان
ممدى حيا
احمد الجزير
محمد سطوح
الرضاء
الزويد
الرياح
زبان احمد
الاصاغن
الاسلام
الباغن
احمد عباس

الرحمن
السقاره
محمد بلال
عبد الرحمن
الزويد
المرزوقه
خالد فؤاد
ابو حماد الرضا

اسكاف
محمد حامد
الزويد
فان مرزوق
الاصاغن
الرياح
زبان احمد
الاصاغن
الاسلام
الباغن
احمد عباس

الزويد
المرزوقه
خالد فؤاد
ابو حماد الرضا

المفحمه
طريق المنية
الاصاغن
الرياح
زبان احمد
الاصاغن
الاسلام
الباغن
احمد عباس

الاصاغن
الرياح
زبان احمد
الاصاغن
الاسلام
الباغن
احمد عباس



حي السلام ١

المناطق المحرومة بحى السلام

الشركة المنفذة : شركة كونكورد للهندسة والمقاولات


الهدف من المشروع : إلغاء المجمع القديم المنفذ بشارع إبراهيم اللقانى والقبه عام ١٩٠٧ لسوء حالته وإنهاء عمره الافتراضى وكثرة الهبوطات به

مكونات المشروع : عدد (٩) شوارع بالمرج الشرقية ٣٩ شارع بالمرج الغربية [منطقة أم باب - المنطقة الصناعية بجسر السويس ك ١٨ - قباء - تقسيم أبو بكر الصديق - التجاريين - السادات - الحرفيين - أبو رجيلة (٣)]

قيمه المشروع : 65 مليون جنية

الموقف التنفيذى : جارى العمل

نسبه التنفيذ : ١٠ %

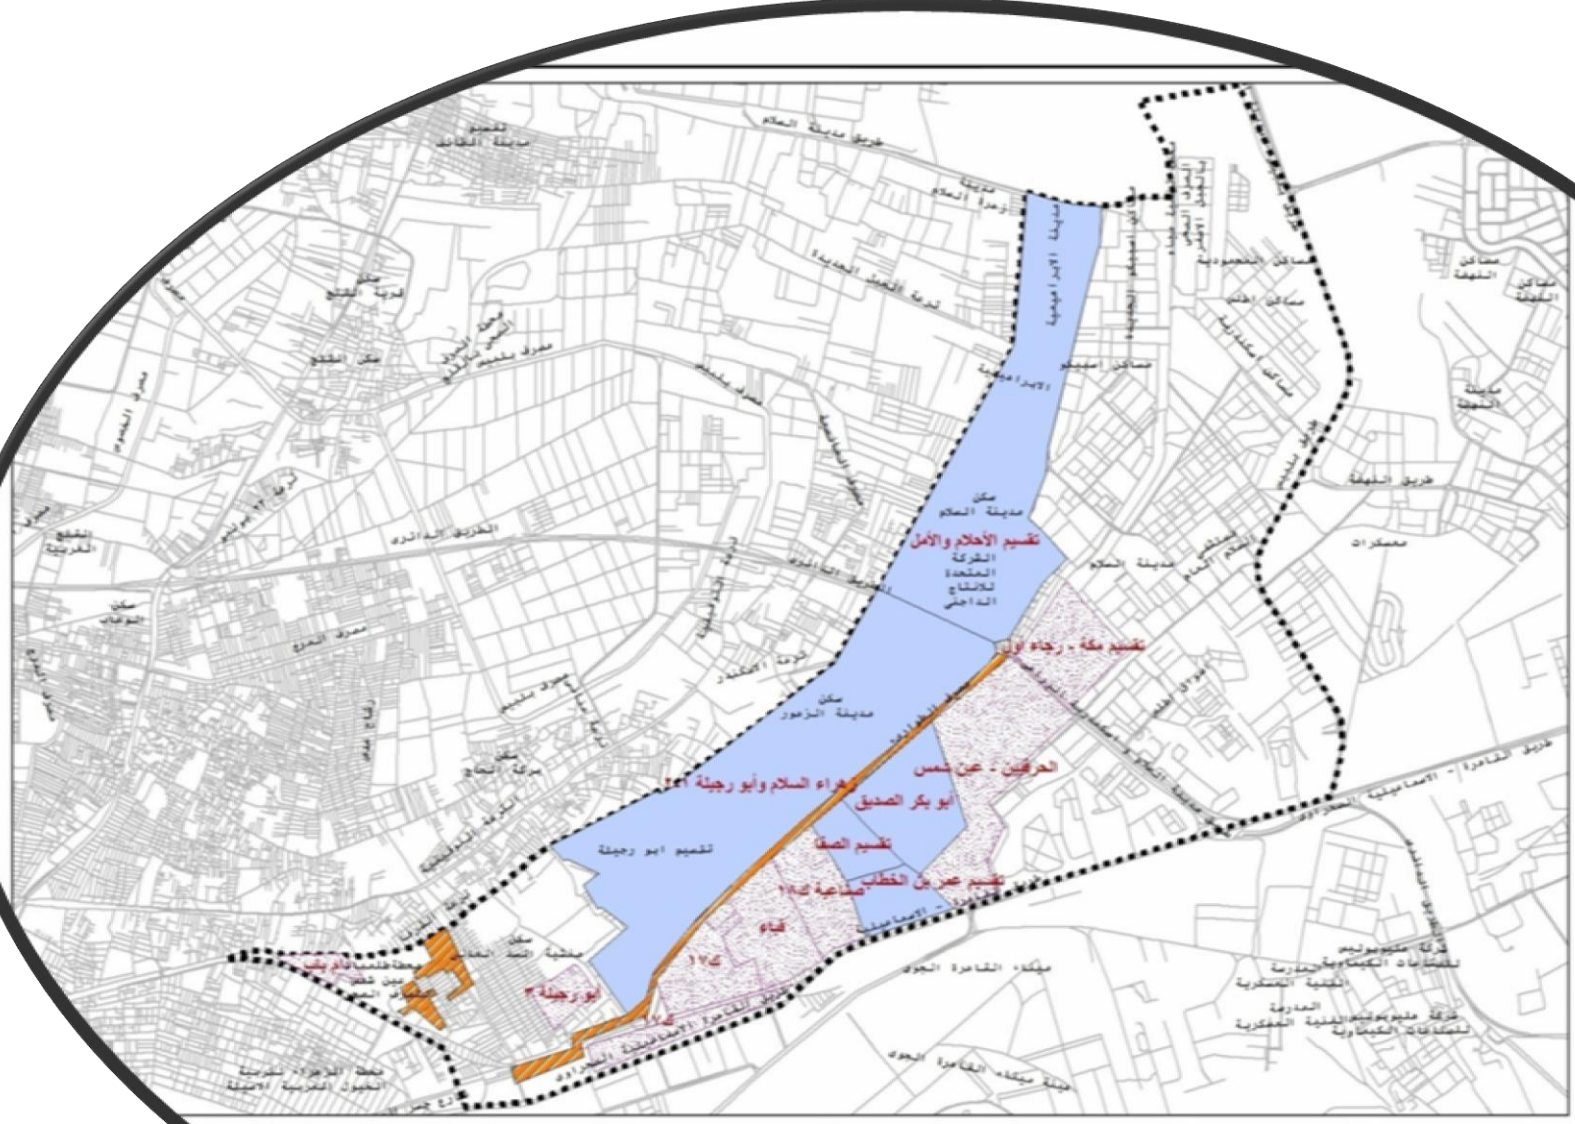

رقم الوثيقة :	
التاريخ :	
مقياس :	

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي



شركة الصرف الصحي بتقانة التكرير
الإدارة العامة لتنظيم المشروعات
إدارة نظم المعلومات الجغرافية
المخطط العام

المالك :

شحي السلام ١

Pr...

ابو رجيلة ٣

شارع ٢٧

شارع الخمسين

ترعتي الطوارئ

ابو رجيلة ٣

جسر السويس





المنطقة الصناعية الكيلو ١٨ ارض عماد نصر

محور الطوارئ

المنطقة الصناعية
الكيلو ١٨ ارض عماد نصر

جسر السويس

الطهاوي

© 2013 Google
Image © 2013 DigitalGlobe
© 2013 ORION-ME



تقسيم مكة ورجاء اول



محور الطوارئ
تقسيم مكة
ورجاء اول

المحطة
الحلزونية

الطريق الدائري

© 2013 Google
Image © 2013 DigitalGlobe
© 2013 ORION-ME

Google



مدينة قباء

محور الطوارئ

الشيخ فاري

مدينة قباء

جسر السويس

الظهاوى

طريق المطار

2013 Google
Image © 2013 DigitalGlobe
© 2013 ORION-ME

Google earth



ردم ترعتى الطوارىء وتشغيل المحطة الحلزونية بكوبرى (٣) بمدينة السلام

الهدف من المشروع : تغطية ترعة الطوارىء ورفع المياه من المحطة الحلزونية الى المصب

محطة الرفع الحلزونية بكوبرى (٣)

الشركة المنفذة : شركة إيجيكو

مكونات المشروع : محطة رفع عدد (٢) مرحلة بتصرف ١.٠ مليون م^٣/ يوم

قيمه المشروع : ٧٨ مليون جنيه

الموقف التنفيذى : تم الإنتهاء من المشروع وتم تشغيل عدد (٧) ظلمبات حلزونية

ومتبقى إصلاح عدد (٧) لوحات كهربائية وعدد (٧) وحدات

حلزونية ومطلوب قيام الجهاز التنفيذى بسداد قيمة فروق الأسعار

للمقاول وصرف المستخلصات المتوقفة مما تسبب فى إيقاف التنفيذ

نفق ترعتى الطوارىء

الشركة المنفذة : شركة إم سى إنترناشيونال

مكونات المشروع : نفق صرف صحى بطول ٥.٥ كم قطر ٣.٢٥ م

شامل أعمال تحويلات الخطوط من الترعتين إلى غرف النفق

قيمه المشروع : ٨٠ مليون جنيه

ترعه الطوارئ



المحطة الحزونية
بمدينة السلام

الطريق
الدائري


٢٠٢٥
مجمع ترقية الطوارئ

شارع جمال
عبد الناصر

طريق الاسماعيلية
القاهرة

شارع جوزيف تينو


مطار القاهرة

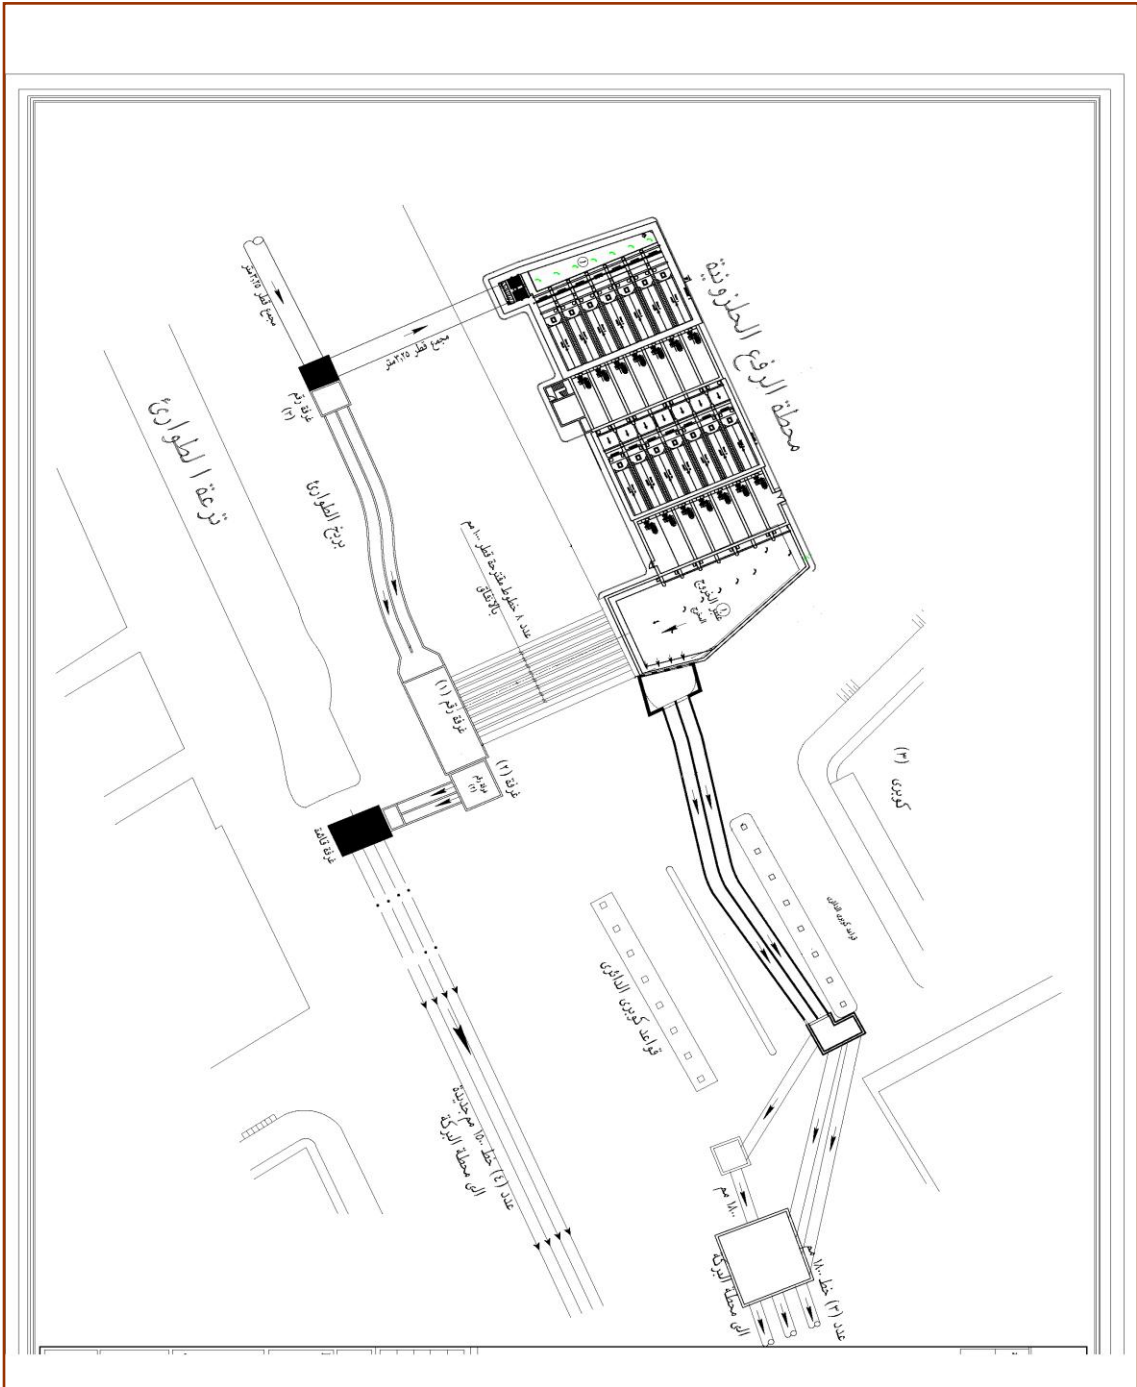

محطه الرفع الحزوني





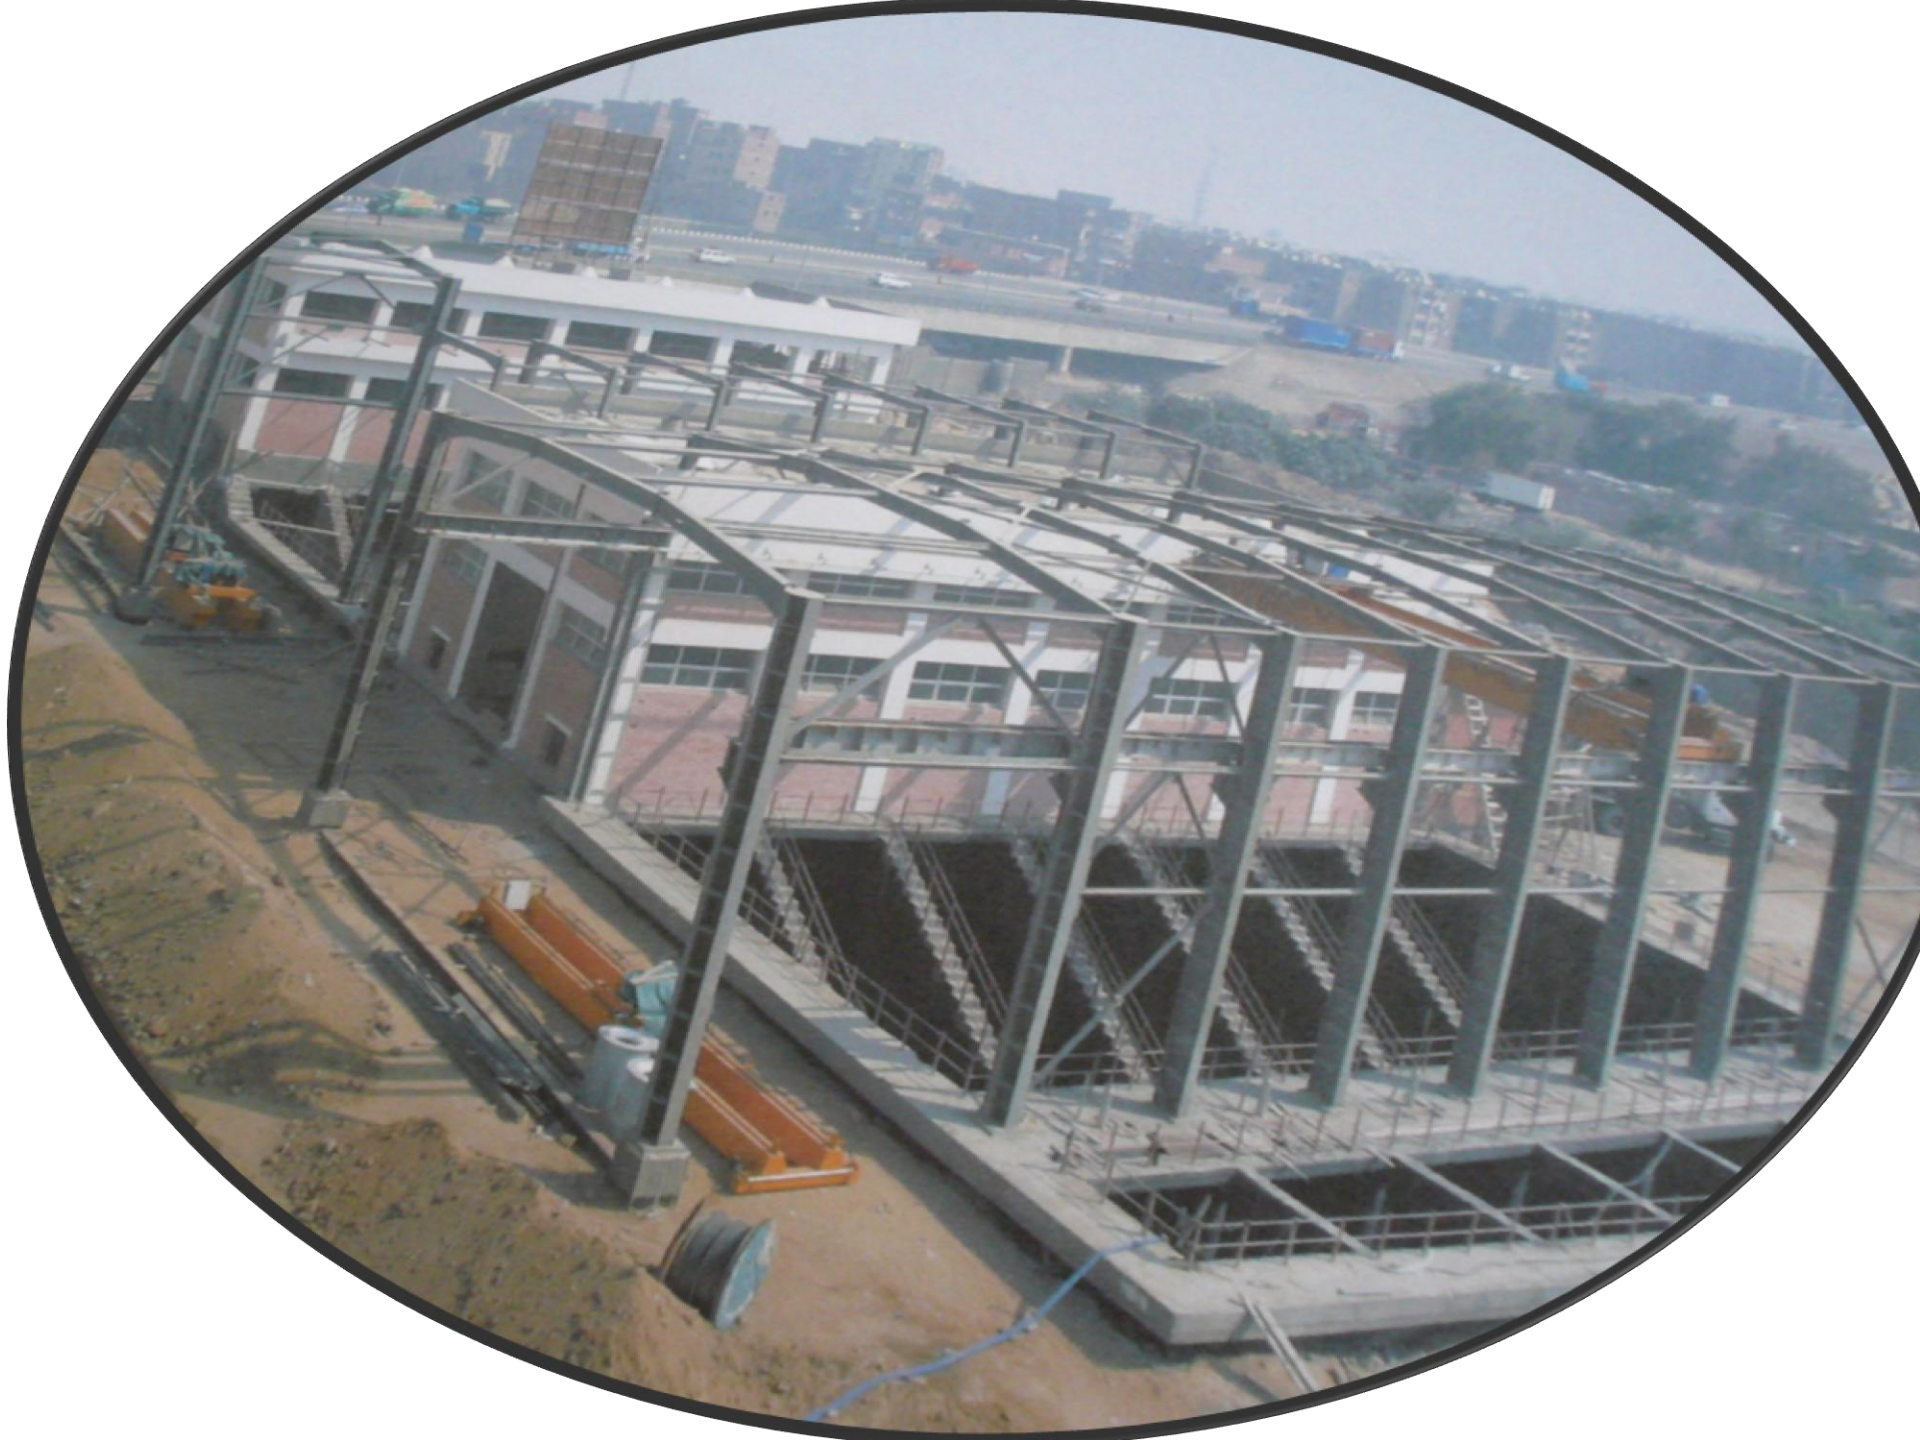



الشركة المنفذة	: شركة كونكورد للهندسة والمقاولات
الهدف من المشروع	: حلال وتجديد الخطوط والمجمعات الناقلة من محطة الرفع الحلزونية حتى محطة معالجة البركة .
قيمه المشروع	: ١٩٧ مليون جنييه
مكونات المشروع	: <p>٠ عدد (٣) خط قطر ١٨٠٠م وعدد (٢) خط قطر ٢.٢٥م بإجمالي أطوال للخط الواحد</p> <p>٣.٥ كم للخط الواحد وعدد (٢٦) غرفة من البركة حتى المحطة الحلزونية</p> <p>على ثلاث مراحل كالتالي :</p> <p>-المرحلة الأولى : من غرفة (١) مخرج الحلزونية وحتى غرفة (١٠) عدد(٣) خطوط قطر ١٨٠م بطول ١.٥كم للخط الواحد بإجمالي ٤.٥ كم وعدد (١٤) غرفة وتم نهو المرحلة وتسليمها وتشغيلها في ١٤/٥/٢٠١٤ .</p> <p>المرحلة الثانية : من غرفة (١٣) حتى محطة معالجة البركة بطول ١.٥ كم للخط بمواسير قطر ٢.٢٥ بعدد (٢) خط حتى غرفة ١٧ ومن غرفة ١٧ حتى محطة رفع البركة القديمة بطول ٩٢٠م بنسبة إنجاز ٩٠% وجارى التشطيب .</p> <p>المرحلة الثالثة : من غرفة (١٠) حتى غرفة (١٣) بطول ٤٠٠م/ط عدد (٢) خط قطر ٢.٢٥م بنسبة إنجاز ٧٥% ومتبقى نفق بطول ١٨٨م/م جارى تنفيذه حالياً</p> <p>سيتم نهوها في ١٥/٦/٢٠١٥ بقيمة ٢٠.٠ مليون .</p>
تاريخ النهو	: ٢٤/١١/٢٠١٥
نسبه الانجاز	: ٨٠% من اجمالي المشروع

محطة البركة

طريق بليس


١٥٠٠ م

الطريق الدائري

الحزونية بالسلام




نبذة عامة عن محطة رفع عين شمس

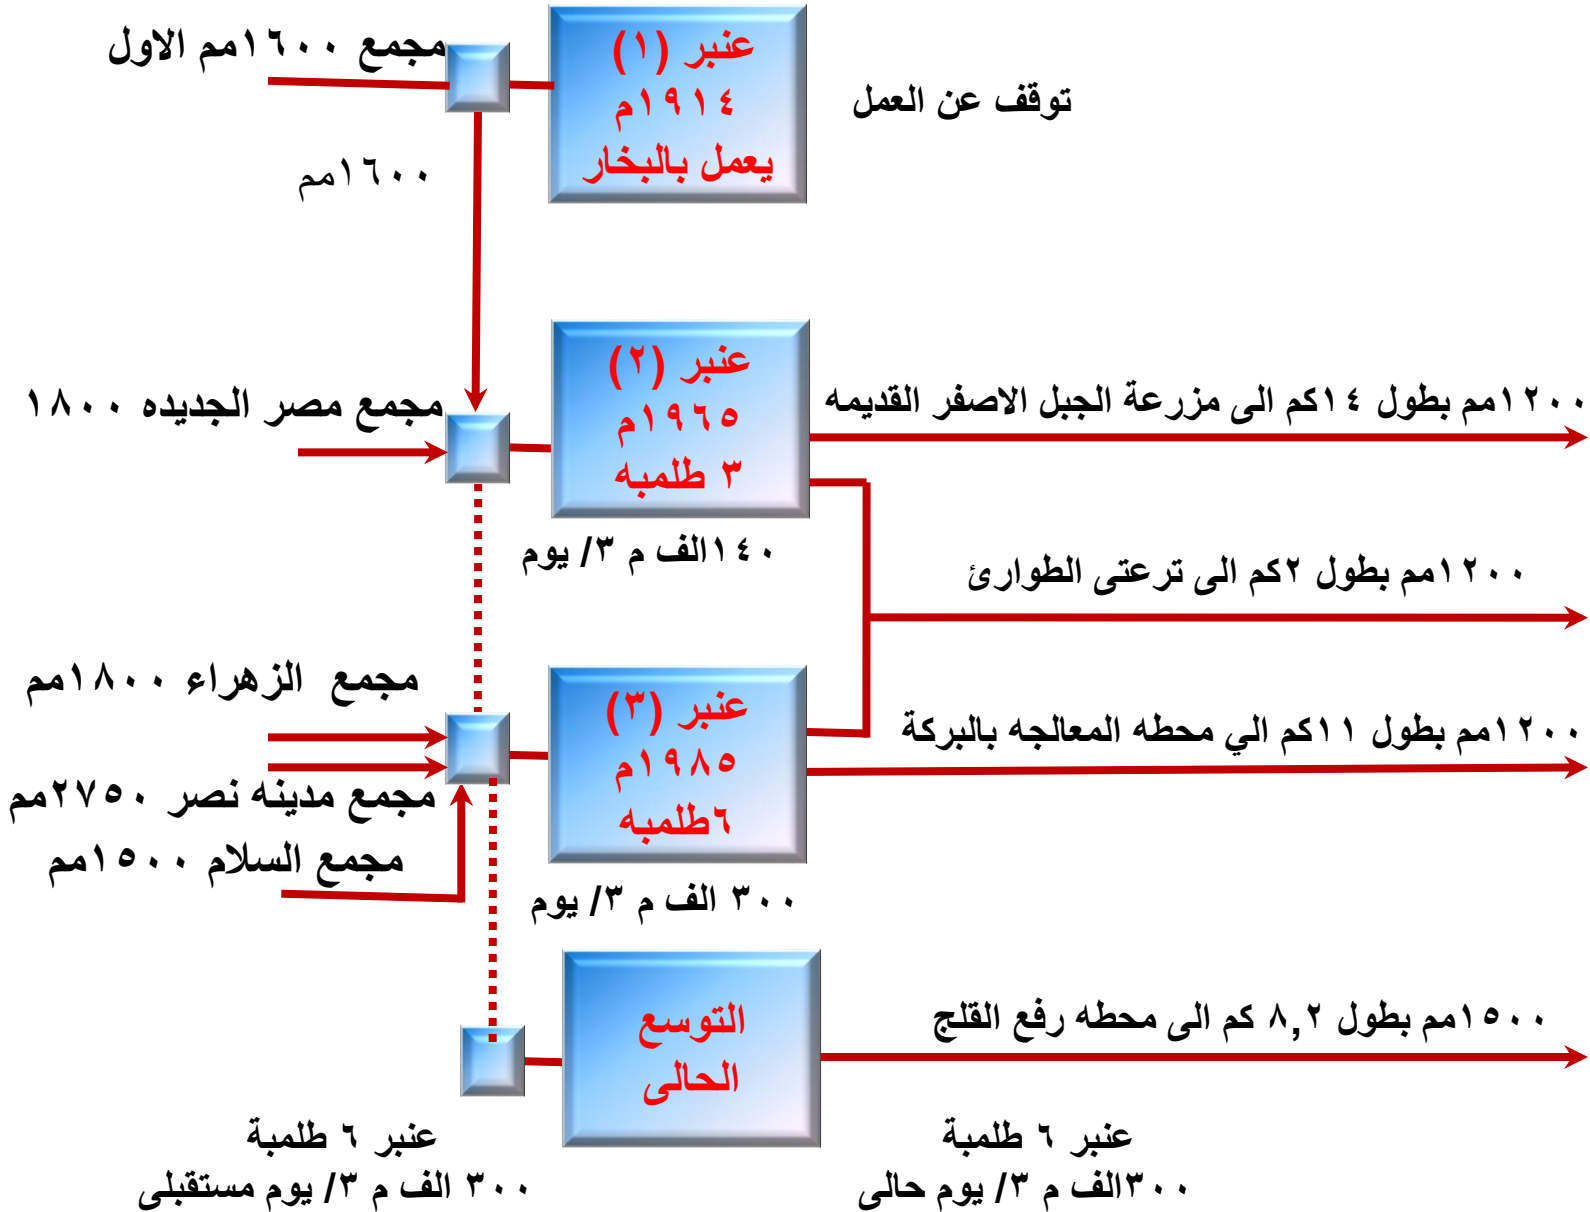


المناطق التي
تخدمها محطة
رفع عين شمس

عين شمس-
المطرية-
شيراتون-
سراي القبة-
مصر الجديدة-
مدينة نصر-
المقطم-

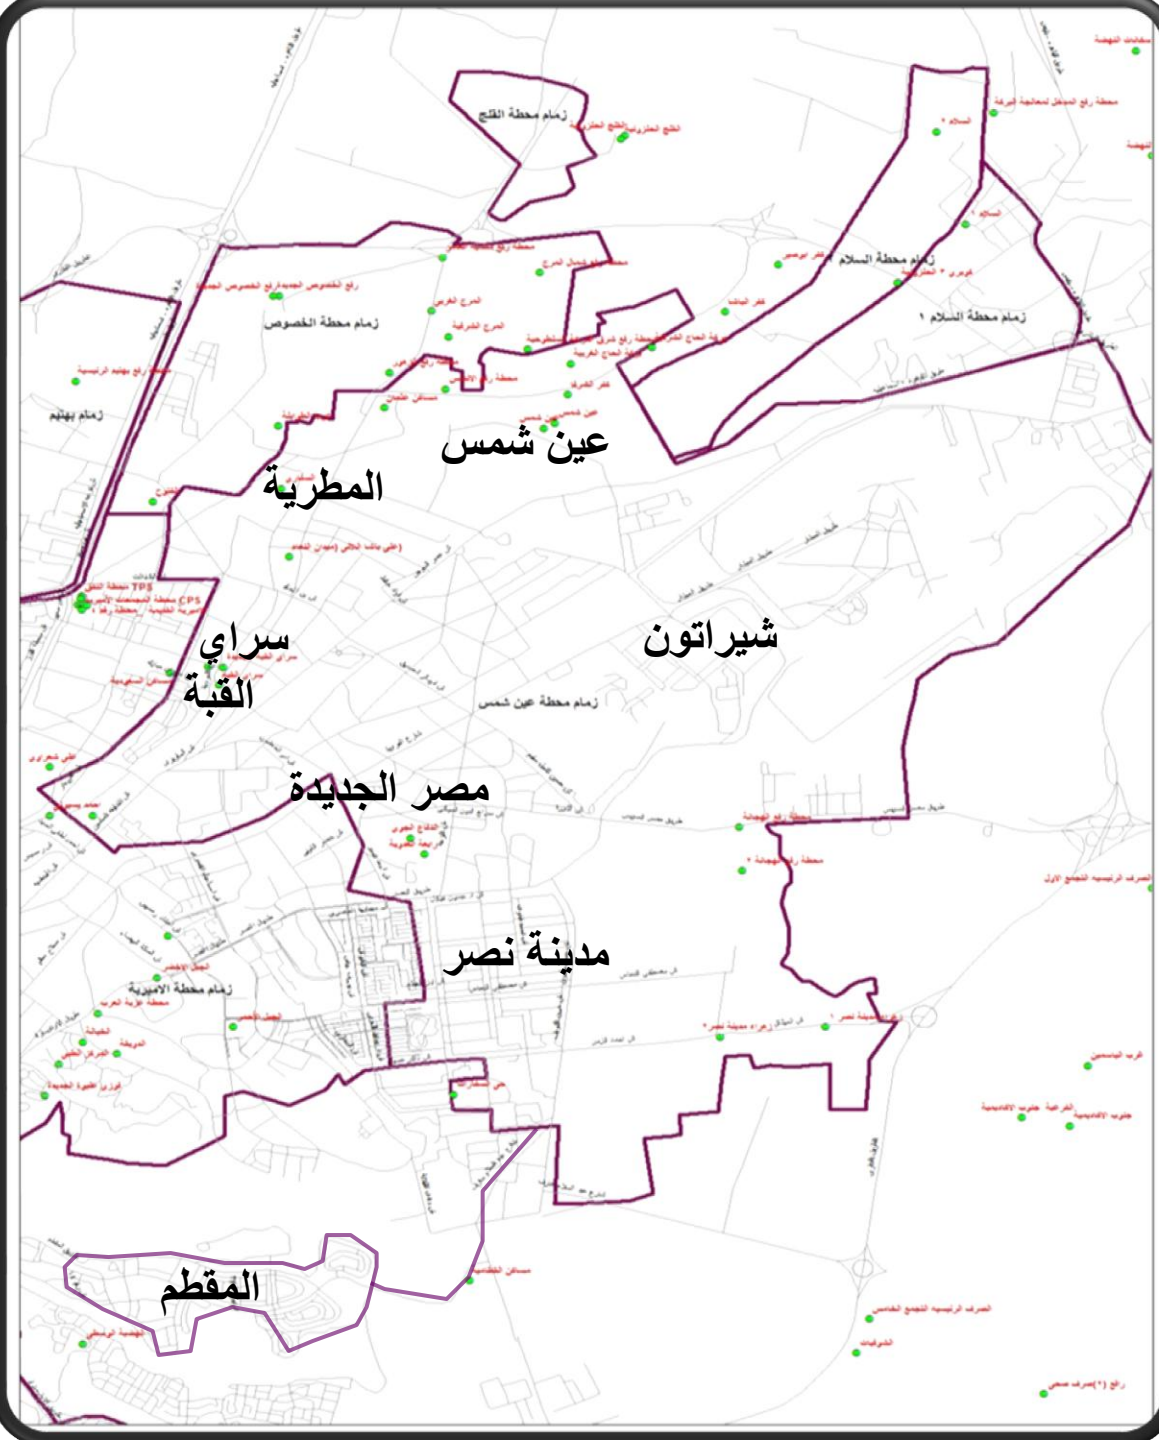


توسعات محطة عين شمس

الشركة المنفذة	: شركة المقاولون العرب
الهدف من المشروع	: رفع طاقة المحطة بزيادة ٣٠٠ ألف م ^٣ / يوم لتصل إلى ٧٥٠ ألف م ^٣ / يوم بدلاً من ٤٥٠ ألف م ^٣ / يوم
قيمه المشروع	: ٦٠٠ مليون جنيه
مكونات المشروع	: <ul style="list-style-type: none">• إنشاء عنبر جديد سعة ٦٠٠ ألف م^٣ / يوم على مرحلتين وتركيب المهمات الميكانيكية والكهربائية لتستوعب ٣٠٠ ألف م^٣ / يوم .• وخط طرد قطر ١٥٠٠ مم بطول ٨.٣ كم من محطة عين شمس حتى محطة القلج الحزونية ماراً بشارع مؤسسة الزكاة .
تاريخ البدء	: ٢٤/٨/٢٠٠٩
تاريخ النهو	: ٣٠/٦/٢٠١٥
نسبه الانجاز	: ٩٨ % من الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية

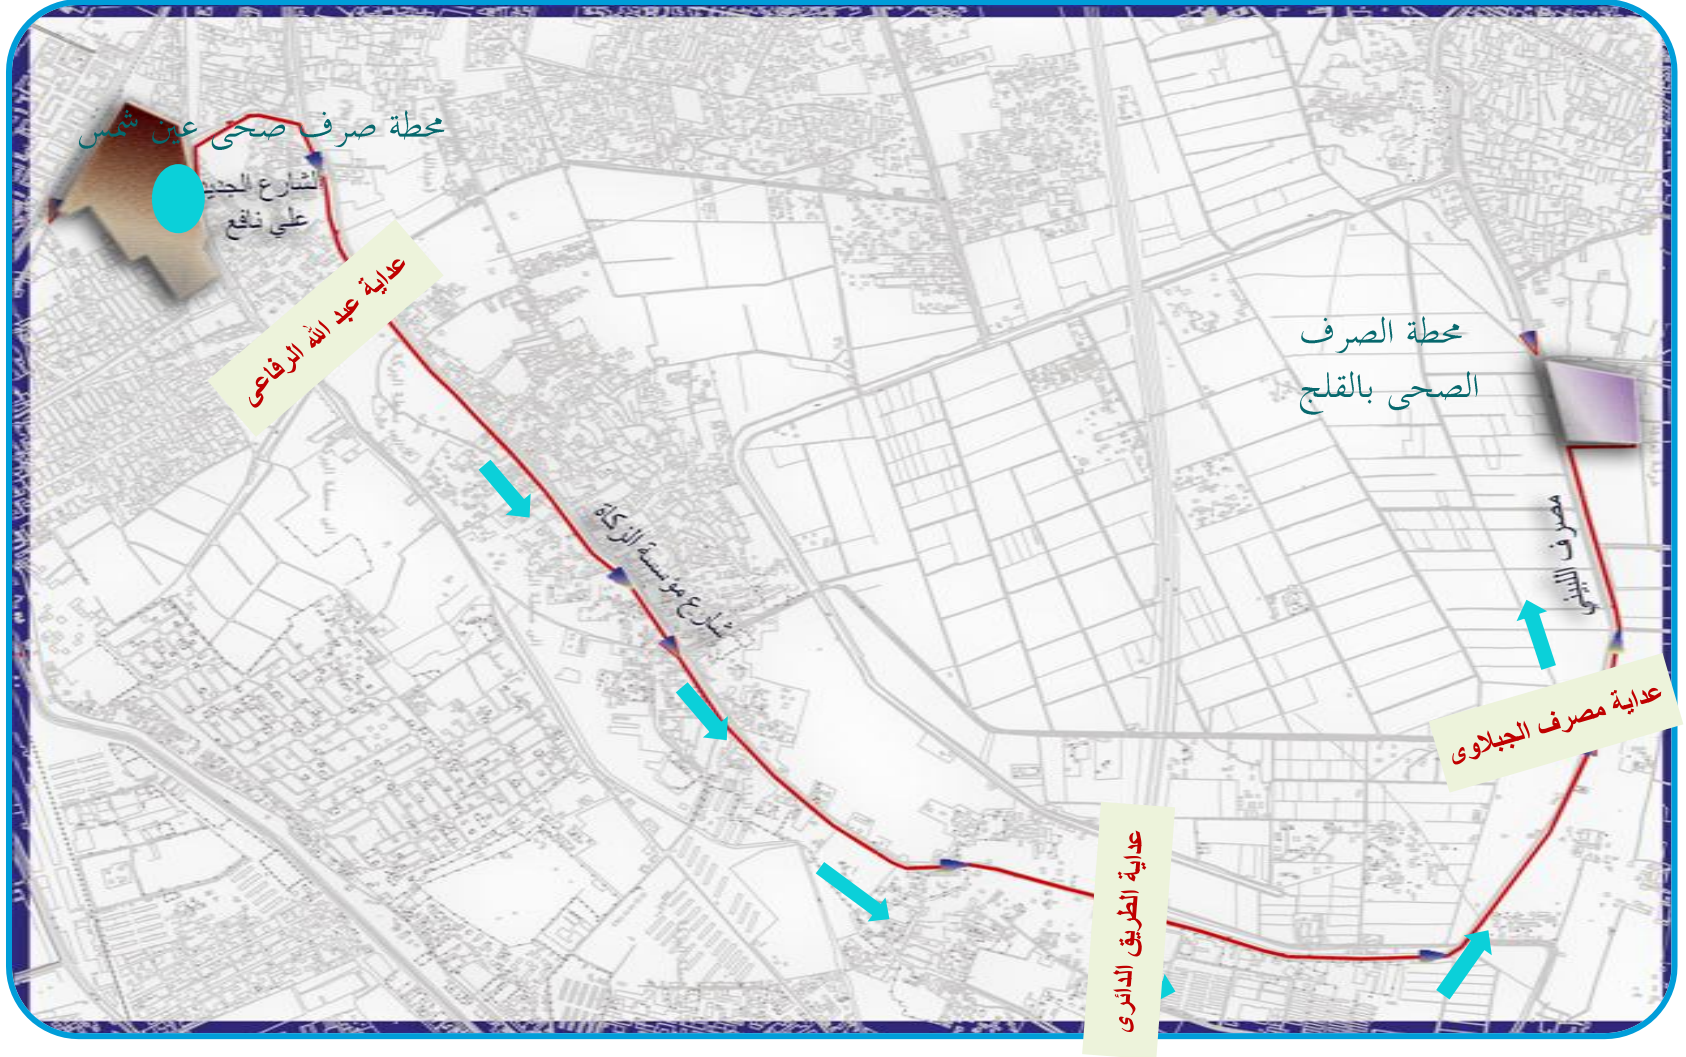

الأعمال الكهروميكانيكية قدرة ٣٠٠ ألف م٣/يوم - كمرحلة أولى

- عدد (٦) ظلمبات تصرف الواحدة ١٢٠٠ لتر/ثانية رفع ٣٥ م
(عدد ٣ أساسى + ٢ احتياطى + ١ صيانة)

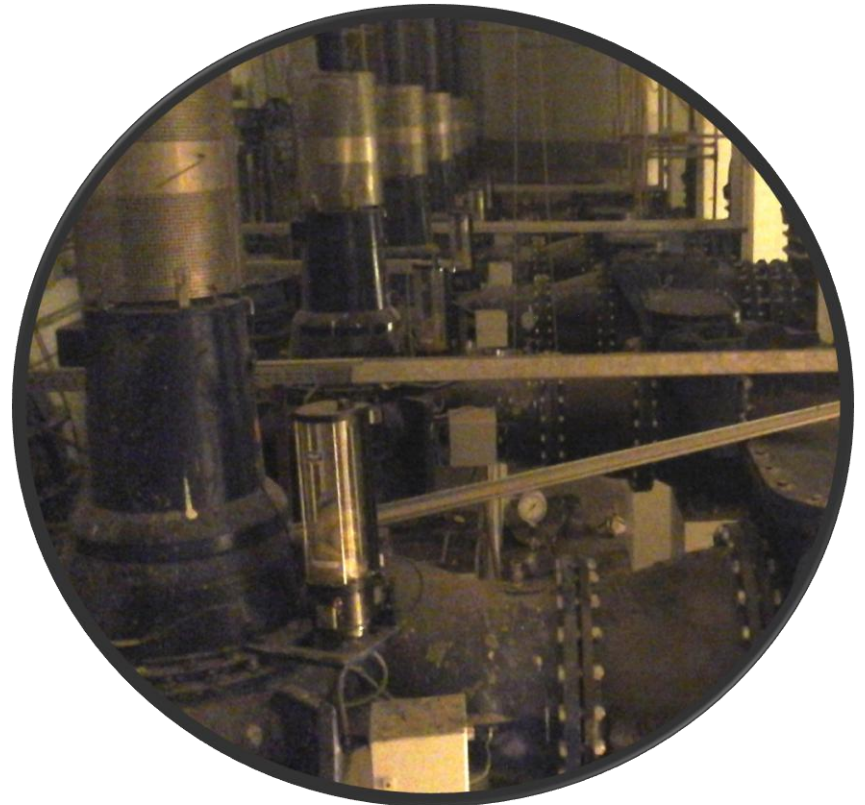



منظر عام لمنطقة العنابر



2015/5/21 08:0

والمنطقة بين العنابر المصافي

خط طرد كمال حجاب

الشركة المنفذة	: شركة المقاولون العرب
الهدف من المشروع	: إحلال وتجديد خط الطرد القديم الخاص بالمحطة القديمة المنفذ عام ١٩٣٣ قطر ١٢٠٠ مم ودائم الكسر بشارع كمال حجاب .
قيمه المشروع	٦٠٠ مليون جنية
مكونات المشروع	: • خط طرد قطر ١٢٠٠ مم بطول ١.٤ كم + توريد عدد (٢) ظلمبة تصرف الواحدة ١٢٠٠ ل/ث عند رافع ٤٩ م .
الموقف التنفيذي	: • تم موافاة الجهاز التنفيذي لإستكمال الإجراءات اللازمة للتنفيذ بالرسومات والمواصفات .

ثانياً :

الجنوب وخطوان

توسعات محطة حلوان رقم (١)

الشركة المنفذة	: : شركة كونكورد للهندسة والمقاولات
الهدف من المشروع	: : احلال وتجديد الخطوط والمجمعات الناقلة من محطة الرفع الحلزونية حتى محطة معالجة البركة .
قيمه المشروع	٧٨.٣٨٤ مليون جنيهه
مكونات المشروع	: : العنبر الحالي منفذ منذ عام ١٩٩٢ . يتكون من : (٤) طلمبة تصرف الواحدة ١.٥٠ م ^٣ /ث (٢) طلمبة تصرف الواحدة ١.٠٠ م ^٣ - توسعه عام ٢٠٠٧ - • عدد (٢) طلمبة تصرف ١.٥ م ^٣ /ث • عدد (٢) طلمبة تصرف ١.٠ م ^٣ /ث • عدد (٢) خط قطر ١٥٠٠ مم حتى المعالجة - التوسعات المقترحة • إنشاء عنبر جديد يحتوى على عدد (٥) طلمبات تصرف الواحدة ١.٢ م ^٣ /ث + مولد كهربائى قدرة ٤.٨ ميغافا . • قطر البيارة ٢٥ م بإجمالى تصرف ٤٠٠ ألف م ^٣ /يوم
تاريخ النهو	٢٦/٨/٢٠١٥
نسبه الانجاز	الأعمال المدنية ٨٥% والأعمال الكهروميكانيكية ٥٥% توريدات فقط






CAPACITY
10,000 kg

KONCAR



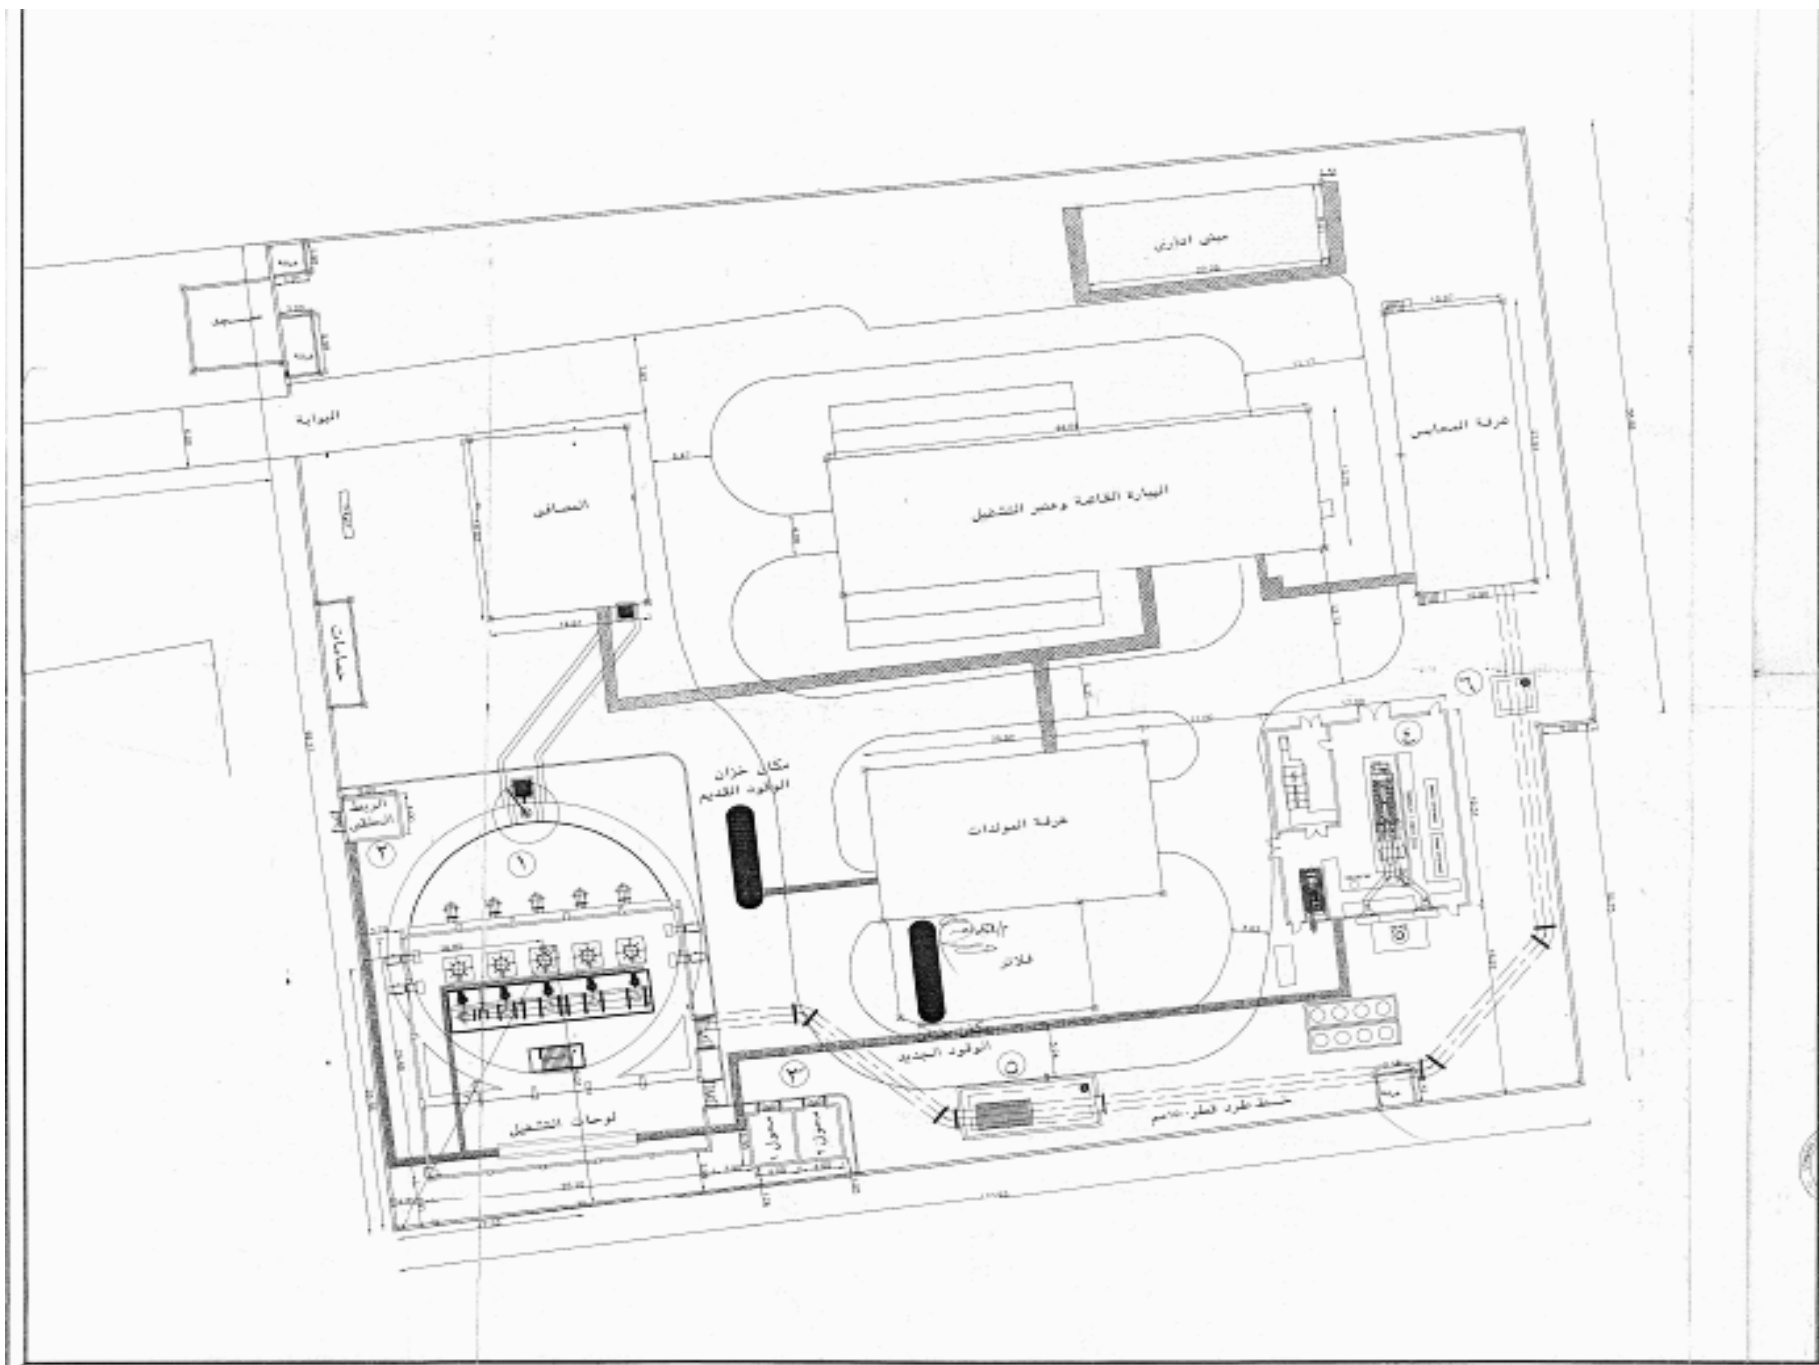








إحلال وتجديد عقد (٣) حلوان

<p>شركة كونكورد للهندسة والمقاولات</p>	<p>الشركة المنفذة</p>
<p>إحلال وتجديد صرف للخطوط القائمة بالمنطقة لسوء حالة الخطوط القديمة وتكرار حدوث هبوطات بها كالتالي :</p> <ul style="list-style-type: none"> • سنة ١٩٩٧ حدث هبوط بفرعة ٩٠٠ مم أمام حديقة ٦ أكتوبر • سنة ٢٠١٠ حدث هبوط بفرعة ٩٠٠ مم أمام الكبريتاج • سنة ٢٠١٠ حدث هبوط بخط ١٢٠٠ مم بشارع ورش العمرة للطائرات . • سنة ٢٠٠٨ حدث هبوط بفرعة قطر ٨٠٠ مم بشارع صلاح صبحي • تم فحص المشروع بالكامل وتبين إنتشار الشروخ والكسور لسوء نوعية المواسير . 	<p>الهدف من المشروع</p>
<p>٦.٩٧ مليون جنيهه</p>	<p>قيمه المشروع</p>
<p>خط إنحدار قطر [٨٠٠ مم ، ٩٠٠ مم ، ١٢٠٠ مم ، ١٨٠٠ مم] بشارع صالح صبحي وشارع عمر بن عبد العزيز بإجمالى ٦ كم منهم ١.٧ كم بالأنفاق .</p>	<p>مكونات المشروع</p>
<p>٣٠/٩/٢٠١٥ مرحلة أولى ٣٠/١٢/٢٠١٥ باقى المشروع</p>	<p>تاريخ النهو</p>
<p>٤٠ %</p>	<p>نسبه الانجاز</p>

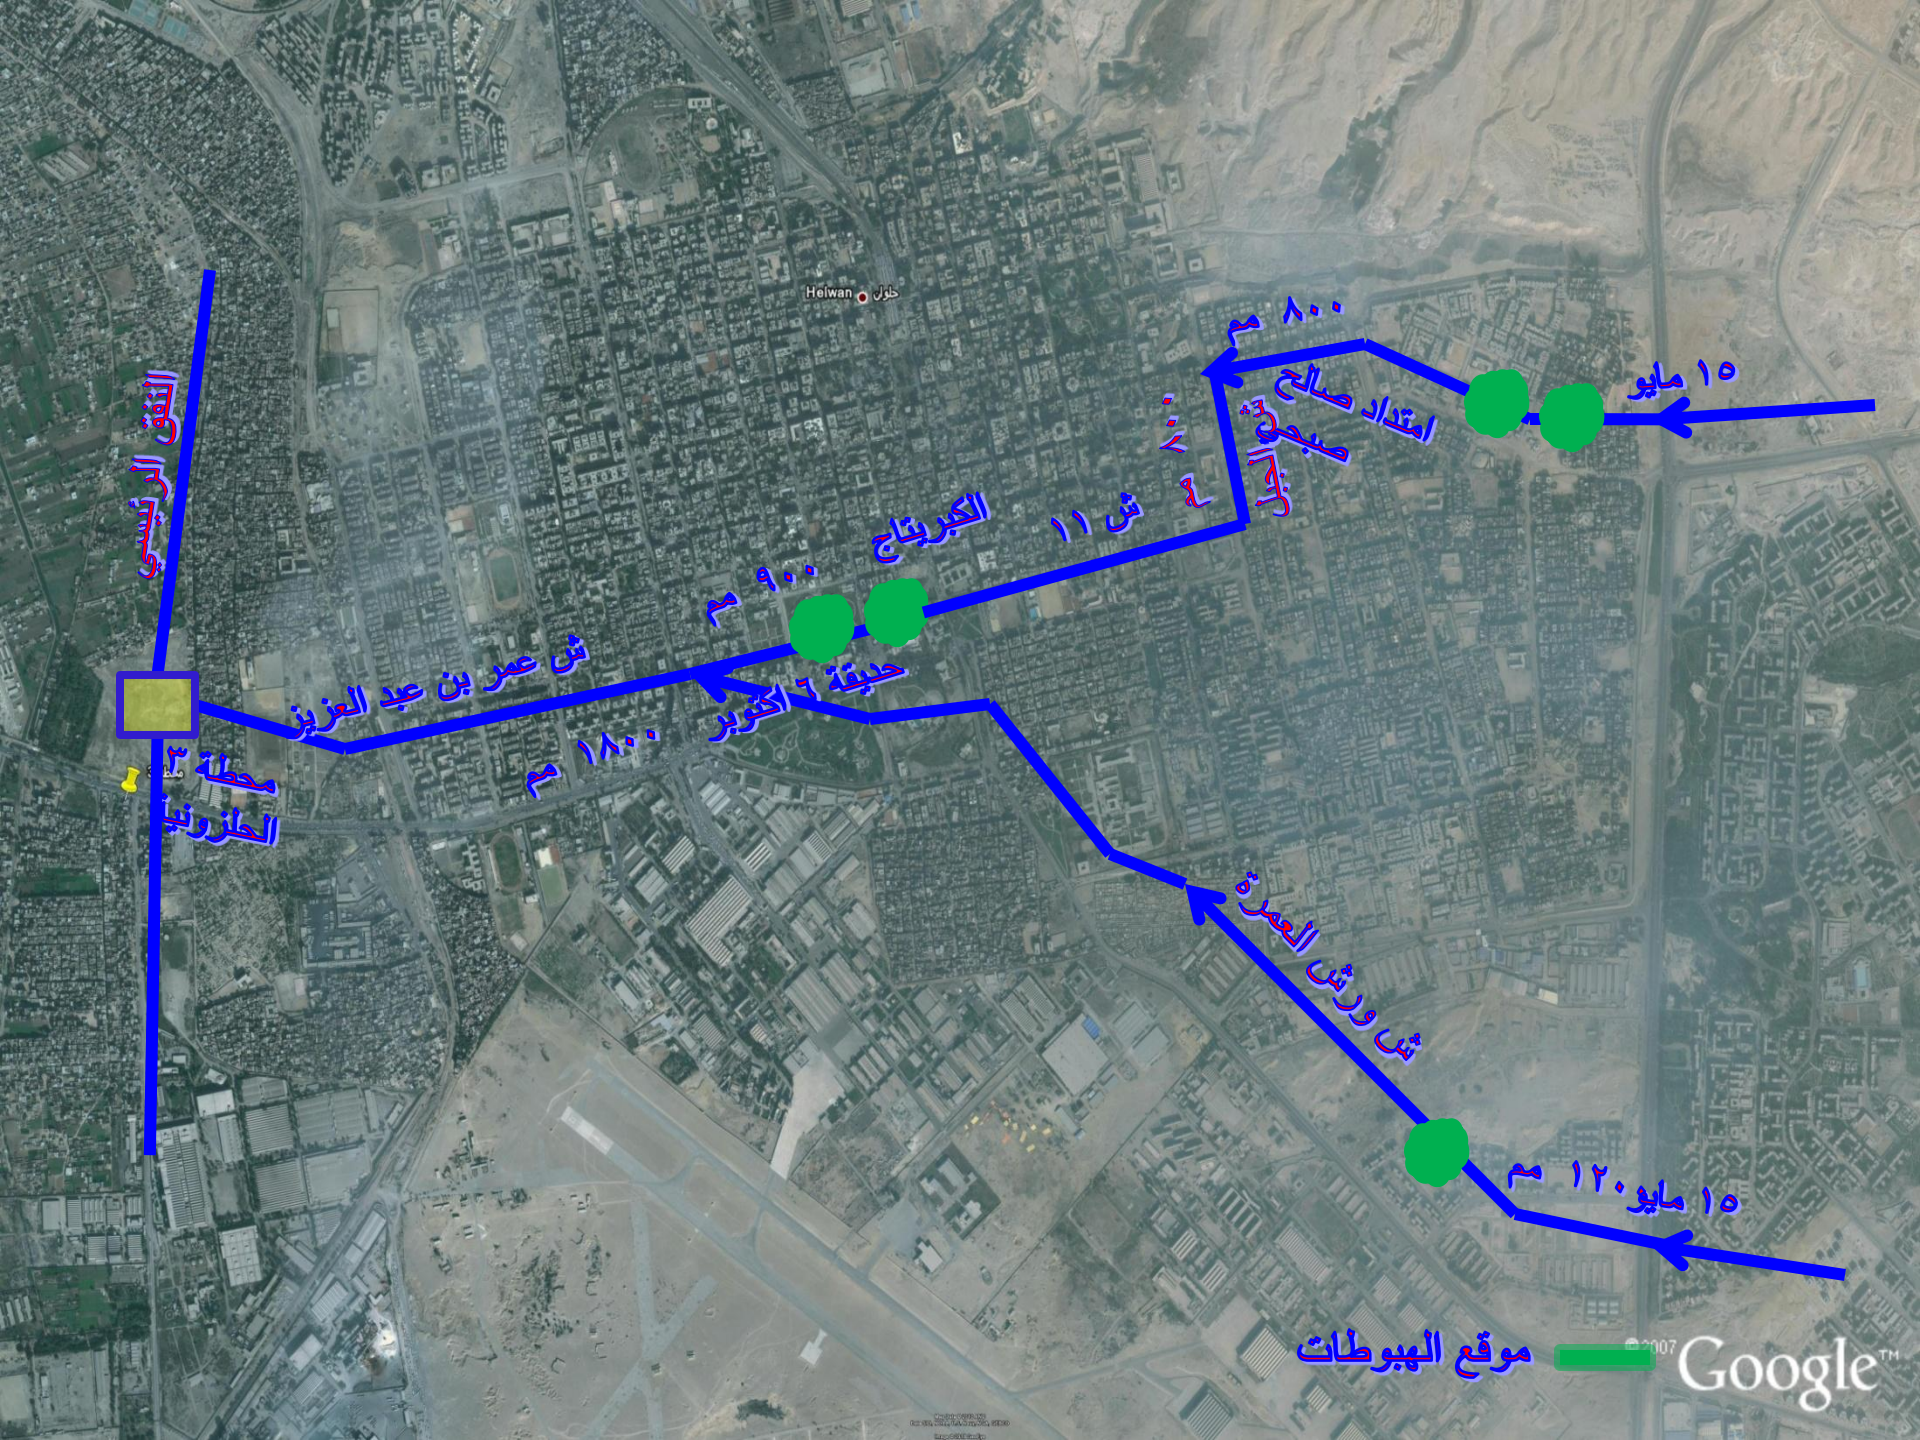

النقى الرئيسي



محلّة الطرزيّة

ش ١١
ش ١٥ مايو

ش ١١
ش ١٥ مايو

ش ١١
ش ١٥ مايو

الكبريتاج

ش ١١

ش ١١
ش ١٥ مايو

ش ١٥ مايو

ش ورش العصرة

ش ١٥ مايو ١٢ مايو

Heiwan
حون

موقع الهبوطات

تحسين صرف شارع إبراهيم زيدان بكوتسيكا

الشركة المنفذة	:	الشركة الدولية للإنشاءات
الهدف من المشروع	:	احلال وتجديد الخطوط والمجمعات الناقلة من محطة الرفع الحلزونية حتى محطة معالجة البركة .
قيمه المشروع	:	٥.٢٥ مليون جنيه
مكونات المشروع	:	خط إنحدار قطر [٦٠٠ مم] وعداية أسفل مترو الأنفاق
تاريخ النهو	:	٢٤/٨/٢٠١٥
نسبه الانجاز	:	٦٠ % - تم فهو النفق وجرى العمل بالشوارع الجانبية

طريق مصر حلوان الزراعي


قطر ٣٢ بوصة

شارع جمال عبد الناصر

شارع زيدان ابراهيم

نقـق جزيرة دار السلام

الشركة المنفـذة	:	الشركة الدولية للإنشاءات
الهدف من المشروع	:	احلال وتجديد الخطوط والمجمعات الناقلة من محطة الرفع الحلزونية حتى محطة معالجة البركة .
قيمه المشروع	:	٢٥ مليون جنيهه
مكونات المشروع	:	خط بالأنفاق قطر [١٥٠٠ مم ، ١٠٠٠ مم] بشارع الجسر البراني لإلغاء محطة رفع جزيرة دار السلام بطول ٦٠٠م/ط
الموقف التنفيذي	:	المشروع لم يبدأ تنفيذه رغم أهميته لسوء حالة محطة جزيرة دار السلام وخطوط الصرف الداخلة عليها منف ١٥ من مواسير G.R.P دائمة الهبوطات .

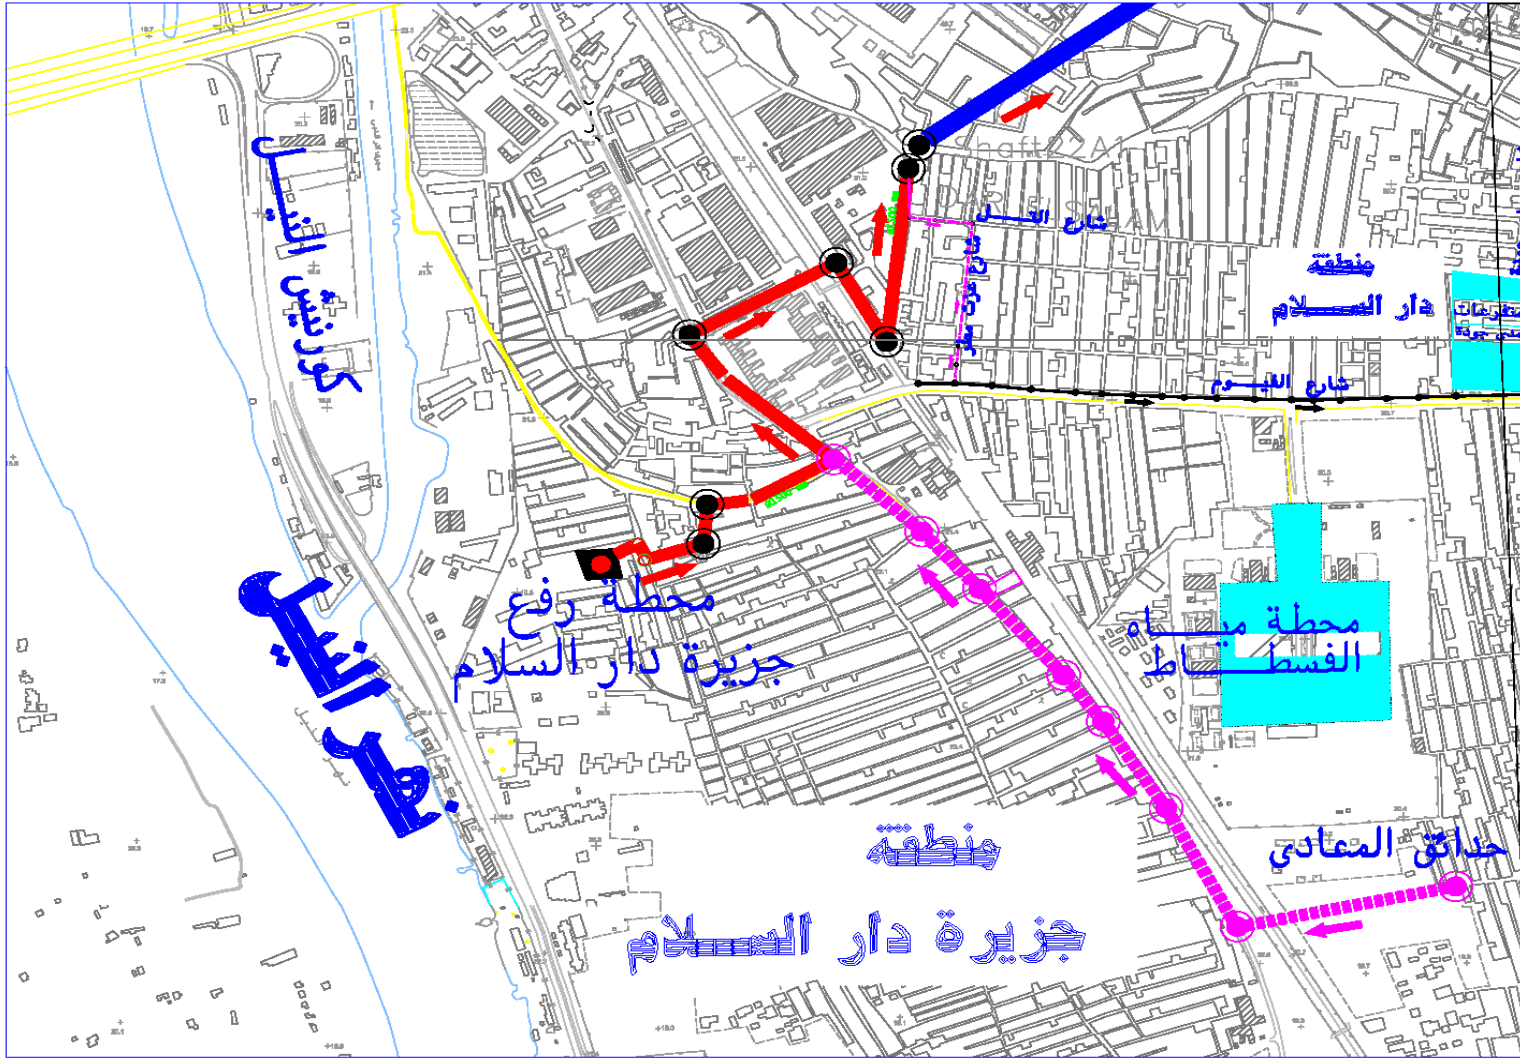


النفق الفرعي لجزيرة دار السلام

- النفق الصخري عقد ١٣
- النفق الفرعي
- مجمع رئيسي

شبكة الصرف الصحي للأرض الإيرانية الصناعية بالبساتين

الهدف من المشروع	:	احلال وتجديد الخطوط والمجمعات الناقلة من محطة الرفع الحلزونية حتى محطة معالجة البركة .
قيمه المشروع		٦.٣٥٠ مليون جنيهه
مكونات المشروع	:	شبكة إنحدار أقطار ["٩ ، "١٨ "] بإجمالي ٥ كم ومحطة رفع وخط طرد قطر ٤٠٠ مم بطول ١.٥ كم وفاروغة أسفل الطريق الدائري .
الموقف التنفيذي		<ul style="list-style-type: none">• تم تنفيذ الخطوط والبيارة• تم تنقيذ خط الطرد وجارى الربط على المصب شافط ٢٣
نسبه التنفيذ		• ٦٠ %

منطقة الارض الايرانية

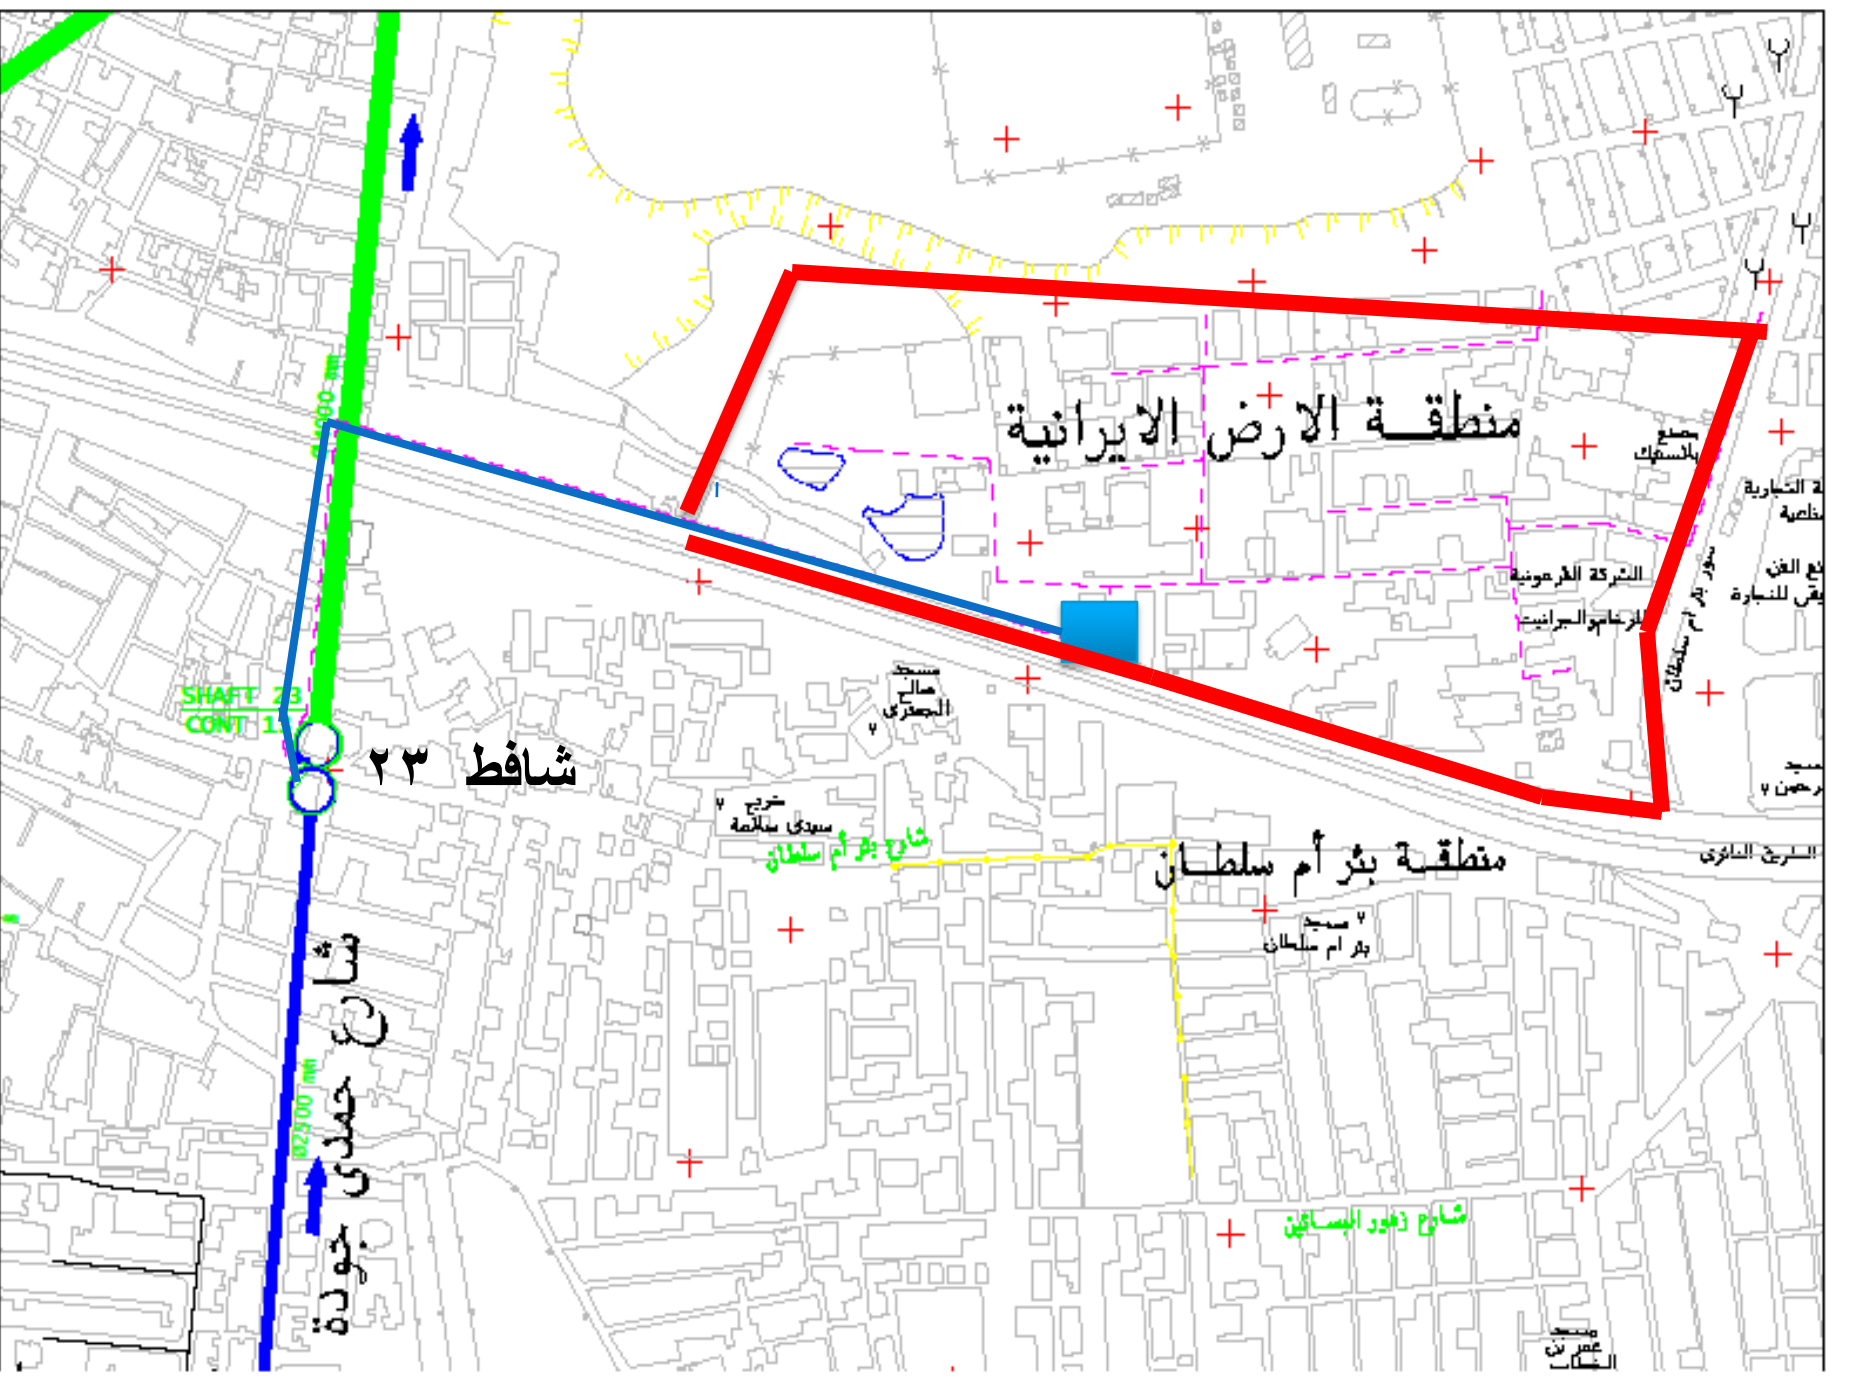

SHAFT 23
CONT 1

شافت ٢٣

شارع حمدي جودة
825.00 mm

640.00 mm

شارع بتر أم سلطان

منطقة بتر أم سلطان

شارع بتر أم سلطان

شارع زهور المساكين

شارع الجعفري

شارع سيدى سلامة

صنع بالاسفك

الشركة القرمونية
المزاجاتو المبرانت

شارع بتر أم سلطان

شارع السراي

شارع بتر أم سلطان

مشروعات الاحلال والتجديد
محافظة القاهرة
للعام المالى ٢٠١٤/٢٠١٥

مشروعات احلال وتجديد خطوط الصرف الصحي للقاهرة الكبرى

1. احلال وتجديد خطوط الصرف الصحي بشارع ولى العهد(عقد ٤١)
2. احلال وتجديد بعض شبكات الصرف الصحي بمنطقة سبيكو القديمة بحى السلام (عقد ٢٩)
3. احلال وتجديد بعض شبكات الصرف الصحي بمنطقة المعراج ٧ و٨ و٩ (عقد ١٧) و (عقد ١٤)
4. احلال وتجديد خطوط الصرف الصحي بمنطقة طرة والمعصرة ومناطق جنوب القاهرة (عقد ٣١) .
5. تغيير جزء من خط طرد محطة طه حسين بالزمالك (عقد ١٥)
6. تطوير محطات الصرف الصحي بمنطقة المنيل ومصر القديمة (عقد ٣٥)
7. احلال وتجديد الصرف بمدينة نصر وبعض مناطق القاهرة الكبرى (عقد ٢٤)
8. احلال وتجديد محطة رفع السنارى للصرف الصحي بالمطرية (عقد ٤٧)
9. احلال وتجديد خطوط الصرف الصحي المكسورة واصلاح الهبوطات الطارئة (عقد ٥٠)
01. احلال وتجديد خط الصرف الصحي اسفل السكة الحديد بشارع 6 اكتوبر بعين شمس

احلال وتجديد خطوط الصرف الصحي بشارع ولى العهد (عقد ٤١)

الشركة المنفذة : كونكورد

قيمة العقد ١١ مليون جنية

تاريخ النهو ١٤-٠٥-٢٠١٦

تاريخ البدء ١٥-١١-٢٠١٣

تم تنفيذ ٥٦٠ م ط قطر ٨٠٠ مم خرسانة
وغرفة الدفع و الاستقبال ودفع المواسير بطول
٦٠ م ط بالانفاق قطر ٨٠٠ مم

بطول ٦٠ م ط بالانفاق قطر ٨٠٠ مم خ م
بطول ٢٢٢٥ م ط قطر ٨٠٠ مم و ٧٠٠ مم
و ٦٠٠ مم و ٤٥٠ مم و ٣٧٥ مم

نسبة التنفيذ : ٤٠ %







2015.02.16 01:04



2014.12.03 02:01

احلال وتجديد بعض شبكات الصرف الصحى بمنطقة سيكو القديمة بحى السلام (عقد ٢٩)

الشركة المنفذة :
السلام للمقاولات والتوريدات

قيمة العقد ٥.٥٠٠ مليون جنية

تاريخ النهو : ٢٠١٥/١٠/١٤

تاريخ البدء : ٢٠١٣/١٠/١٥

المعوقات :

توقف تجديد تصريح الحفر بسبب عدم سداد المقيسة لتالف
الرصف حيث انة تم سداد مبلغ ٧٠٠ الف من ١.٢٠٠ مليون
جنية

*مطلوب قيام الحى بعمل المدادات المكسورة والخاصة بصرف
البلوكات لرطها مع اعمال الشبكة الرئيسية لرفع الطفح

بطول ٤٣٠٠ م ط اقطار من ٩" - ٢٤"

والوصلات المنزلية

نسبة التنفيذ : ٤٥ %



محطة
شن المخيزر العسكري

٣٠ بوصه

السلام

العبد
القديمة

منطقة اسبيكو القديمة

شن اسبيكو، ٢ بوصه

شن الرشاح

محطة البركة

© 2009 ORION-ME
© 2009 AND
© 2009 Gisrael

© 2007 Google™

Pointer 30°10'44.01" N 31°25'12.27" E

Streaming ||||| 100%

Eye alt 10463 ft





2014.11.13 01:53



2014.01.05

احلال وتجديد بعض شبكات الصرف الصحي بمنطقة المعراج ٧ و٨ و٩ (عقد ١٧) و (عقد ١٤)

الشركة المنفذة :
الطوغى والاسمر والشركة الحجازية

قيمة العقد ١.٤٠٠ مليون جنية

تاريخ النهو : ٢٠١٥/٠٨/١

تاريخ البدء : ٢٠١٥/١/١

بطول ٦٥٠ م ط اقطار من ١٥ - ١٨
بطول ٣٦٠ م ط قطر ٢٥٠ مم و ٣١٥ مم

بطول ٧٠٠ م ط اقطار من ١٥ - ١٨
بطول ٤٠٠ م ط قطر ٢٥٠ مم و ٣١٥ مم

نسبة التنفيذ : ٩٠%









احلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بمنطقة طرة والمعصرة ومناطق جنوب القاهرة (عقد ٣١) .

الشركة المنفذة :
سيد عثمان للمقاولات

قيمة العقد ٢.٥٠٠ مليون جنية

تاريخ النهو : ٢٤/١١/٢٠١٥

تاريخ البدء : ٢٥/١١/٢٠١٣

تم تنفيذ بطول بطول ١٢٠٠ م ط قطر ١٨" و ٢٠"
بشارع مخر السيل وفرعة المصب
المعوقات
صعوبة التنفيذ بين المساكن المتهالكة ومخر السيل
وارتفاع منسوب المياه الجوفية

تم تنفيذ بطول بطول ١٦٠٠ م ط قطر ١٨"
و ٢٠" بشارع مخر السيل واقطار اخرى

نسبة التنفيذ : ٧٥%



تغيير جزء من خط طرد محطة طه حسين بالزمالك (عقد ١٥٠)

الشركة المنفذة :
المجموعة المعمارية المتحدة

قيمة العقد ١.٢٤٤ مليون جنية

تاريخ النهو : ٢٠١٥/٠٩/٠٩

تاريخ البدء : ٢٠١٤/٠٦/٠٩

تم تنفيذ بطول بطول ٣٠٠ م ط قطر ٥٠٠ مم
المعوقات

رفض المرور استخراج تصاريح المرور من تقاطع
شارع شجرة الدر مع شارع ٢٦ يوليو وحتى تقاطعة مع
شارع اسماعيل محمد
ومتبقى سداد تالف الرصف بمبلغ ٣٥٣ الف جنية
مطلوب اجتماع بالحي فى حضور المرور التابع للمنطقة

تغيير جزء من خط طرد محطة طه حسين
بالزمالك قطر ٥٠٠ مم مواسير زهر مرن
بطول ٦٥٠ م ط

نسبة التنفيذ : ٤٦ %

محطة طه حسين

شارع شجرة الدر

شارع ٢٦ يوليو

الجزيرة

محطة الزمالك القبلية

© 2015 ORION-ME
© 2015 Google
Image © 2015 DigitalGlobe

Google







2014.09.18 01:03



2014.09.18 01:08





تطوير محطات الصرف الصحي بمنطقة المنيل ومصر القديمة [محطة المنيل- ومحطة الامام الشافعى] (عقد ٣٥)

الشركة المنفذة :

محمد على ربيع

قيمة العقد ٥.٥٢٣ مليون جنية

تاريخ النهو : ٢٠١٦/٠١/١٨

تاريخ البدء : ٢٠١٠/٠٩/٢٠

المعوقات :

رفض المرور استخراج تصريح المرور ليلا ونهارا
بشارع المنيل من محطة المنيل امام طب الاسنان حتى
محطة السحارة (بشارع لمنيل- ش عبد الهادى - وقطع
ش عبد العزيز ال سعود)
مطلوب : عرض الموضوع على السيد الوزير محافظ
القاهرة

* خط طرد شارع المنيل من محطة طب
الاسنان حتى محطة المنيل مارا" بشارع
المنيل بطول ٥٠٠ م ط قطر ٥٠٠ مم
* تطوير محطة المنيل- ومحطة الامام
الشافعى

نسبة التنفيذ : ٨٥ %



محطة الحديد

محطة السحارة

خط طرد مقترح ٥٠٠ م

تق المنبر

© 2007 Google™

Data SIO, NOAA, US Navy, NGA, GEBCO

Image © 2010 GeoEye



مسار خط الطرد بشارع المنيل



محطة الامام الشافعى





احلال وتجديد الصرف بمدينة نصر وبعض مناطق القاهرة
الكبرى (عقد ٢٤)
الغاء محطة الصرف الصحى لمجمعين المدارس بالهجاة

الشركة المنفذة :
سيد احمد عثمان

قيمة العقد ٢.٠٠ مليون جنية

تاريخ النهو : ٢٠١٦/٠٤/٠١

تاريخ البدء : ٢٠١٤/٠٦/٠٧

جاري العمل وتم تنفيذ ٦٨٠ م ط قطر
١٨" + ١٩ مطبق
٣٣٠ م. ط قطر ١٥" + ٨ مطبق

* خط انحدار ١٥٠٠ م ط قطر
١٨" و ١٥" و ١٢" و ٩"

نسبة التنفيذ : ٧٠%



2014.06.11 23:01



احلال وتجديد الصرف بمدينة نصر وبعض مناطق القاهرة
الكبرى (عقد ٢٤)
احلال وتجديد الصرف الصحى بشارع المزرعة بعزبة الهجانة

الشركة المنفذة :
سيد احمد عثمان

قيمة العقد ١.٠٠ مليون جنية

تاريخ النهو : ٢٠١٦/٠٤/٠١

تاريخ البدء : ٢٠١٤/٠٦/٠٧

تم تنفيذ حوالى ٢٨٠ م ط قطر ٢٠" و ١١
مطبق مربعة

* خط انحدار بطول ٨٠٠ م ط قطر ٢٠"
و ١٨" و ١٢"

نسبة التنفيذ : ٤٠%



2014.06.11 23:10





احلال وتجديد الصرف بمدينة نصر وبعض مناطق القاهرة
الكبرى (عقد ٢٤)
الغاء محطة الرفع بعزبة العرب

الشركة المنفذة :
سيد احمد عثمان

قيمة : ٢.٠٠ مليون جنية

تاريخ النهو :

تاريخ البدء :

المعوقات
عدم موافقه مديرية الطرق على قبول تعهد لسداد
مقايسة تالف الرصف لمديرية الطرق بابلغ ٤٤٦
الف جنية

* خط انحدار بطول ٢٧٠ م ط قطر ٦٠٠
مم فخار وصلة مرنة

نسبة التنفيذ : ٠٠%

احلال وتجديد محطة رفع السنارى للصرف الصحى بالمطرية (عقد ٤٧)

الشركة المنفذة :
محمد على ربيع

قيمة العقد ٨.٠١٠ مليون جنية

تاريخ النهو : ٢٠١٦/٠٦/٣١

تاريخ البدء : ٢٠١٥/٠١/٠١

• تم تنفيذ مطبق التجميع
• جارى العمل بوصلة الدخول
• المعوقات
• قطع الكهرباء عن المحطة يؤدى الى
تعطل نظام النرح الجوفى وارتفاع المياه
الجوفية

- احلال وتجديد عنبر الطلمبات للبيارة القديمة
- انشاء مطبق تجميع للخطوط الداخلة للبيارة
- هدم وانشاء السور حول المحطة
- انشاء مظلة لوحدة التوليد
- توريد عدد (٣) طلمبات جديدة للعنبر القديم
- توريد عدد (٢) طلمبات جديدة للبيارة الاضافية

نسبة التنفيذ : ١٠ %



الحل العاجل لرفع كفاءه محطه فوزى عليوه بمنشاه ناصر

الشركة المنفذة :

محمد على ربيع

قيمة : ٣٥٠ الف جنية

تاريخ البدء : ٢٠١٥/٠٨/١٠

تاريخ البدء : ٢٠١٥/٠٣/١٠

• تم تنفيذ غرفة الطلمبات
• وتوريد وتركيب الونش
• وتنفيذ وصلة الدخول بطول ٢.١٠ م ط
قطر ٤٥٠ مم زهر مرن

* خط انحدار بطول ١٠ م ط قط ٣٠٠ مم
+ خط طرد بطول ٢٥٠ م ط قطر ٢٠٠ مم
+ الجمالون الحامل للونش

نسبة التنفيذ : ١٠٠ %

احلال وتجديد خطوط الصرف الصحى المكسورة

واصلاح الهبوطات الطارئة

احلال وتجديد الصرف بشارع المنصور تقاطع المبتديان

الشركة المنفذة :
المجموعة المعمارية المتحدة

قيمة العقد ٥.٢٤٤ مليون جنية

تاريخ النهو : ٢٠١٥/٠٦/٣٠

تاريخ البدء : ٢٠١٥٠٢/٠١

تم تنفيذ وصلة مستشفى المنيرة وتم تنفيذ وصلة
المصب و بطول ١٠٠ م ط قطر ٩" و عدد ٣ مطبق
المعوقات

وجود خزانة مسلح لمترو الانفاق تعوق العمل
وجارى دراسة تنفيذ باقى المشروع

بطول ١٥٠ م ط قطر ٩" وبميدان الصيفى
بطول ٣٠ م ط قطر ١٢" بالسيدة زينب

نسبة التنفيذ : ٥٥%

شارع المنصور تقاطع المبتديان





2015.01.28 02:11



احلال وتجديد خط الصرف الصحى اسفل السكة الحديد بشارع 6 اكتوبر بعين شمس

الشركة المنفذة :
شكة نور الايمان

قيمة : ٤.٣٥٧ مليون جنية

تاريخ النهو : اكتوبر ٢٠١٥

تاريخ البدء : ١٠/٦/٢٠١٥

جارى استخراج التصاريح

* عمل خط بالانفاق بمواسير خرسانية
مسلحه اسفل الكه الحديد قطر ١٢٠٠ مم
بطول ١٠٠ متر

نسبة التنفيذ : ٠٠%



• مشروعات محافظة القاهرة

- استكمال الصرف لمنطقة شق الثعبان بطره وتنفيذ محطة رفع وخط طرد لخدمة (المرحلة الثانية) للمشروع (عقد ١٤)
- مشروع الصرف الصحي لصرف عمارات الاسكان الاجتماعى محافظة القاهرة اراضي املاك (٢) و(٨) (عقد ٣٧)
- مشروع خط الصرف الصحى الرئيسى لمنطقة المستثمرين بالقطامية (عقد ٣٧)
- مشروع توصيل الصرف الصحى لمنطقةالصناعات الحرفية لتطوير منطقة بطن البقر (عقد ٧٤)

استكمال الصرف لمنطقة شق الثعبان بطره وتنفيذ محطة رفع وخط طرد لخدمة (المرحلة الثانية) للمشروع (عقد ١٤) .

الشركة المنفذة :
الشركة الحجازية

قيمة العقد ٨.٩١٩ مليون جنية

تاريخ النهو : ٢٠١٥/١٢/٣٠

تاريخ البدء : ٢٠١٣/٠٥/٢٤

مطلوب
موافقة السيد الوزير محافظة القاهرة على صرف
باقي مستحقات الشركة والتي بلغت مبلغ ٢.٠
مليون جنية حتى يتم الانتهاء من المشروع

محطة رفع قطر ٨م
خط طرد قطر ٢٠٠م بطول ٤٥٠ م ط
مواسير UOPOVOC
خط انحدار بطول ٢٥٠٠ م ط
قطر ١٠" و ١٢" فخار وصلة مرنة وفرعة
الداخل بطول ٣٠ م ط قطر ١٨" زهر مرن

نسبة التنفيذ : ٨٠%

طريق الاتوستراد

التي حلوان

منطقة شق التعبان الاستثمارية





2013.12.28



مشروع الصرف الصحي لصرف عمارات الاسكان الاجتماعى محافظة القاهرة اراضي املاك (٢)

و(٨) (عقد ٣٧) .

الشركة المنفذة :
الشركة الحجازية

قيمة العقد ٤.٩٧١ مليون جنية

تاريخ النهو : ٢٥/١٠/٢٠١٥

تاريخ البدء : ٢٥/١٠/٢٠١٤

املاك (٢) ت

م تنفيذ الاعمال بنسبة ١٠٠ %

املاك (٨)

لم يصدر الحى تصريح الحفر للعمل بشارع السادات لحين قيام
مديرية الاسكان بسداد مقياسه تالف الصرف
مطلوب استخراج التصاريح بشارع السادات

خطوط انحدار بطول ١٣٤٥ م ط

٦٠٠ م ط قطر ٨٠٠ مم

٣٤٥ م ط قطر ٧٠٠ مم

١٥٠ م ط قطر ٦٠٠ مم

٢٥٠ م ط قطر ٥٠٠ مم

نسبة التنفيذ : ٥٠ %



2014.11.13 02:22



2014.11.13 02:12



2014.11.13 02:12



2014.11.13 02:16



مشروع خط الصرف الصحي الرئيسي لمنطقة المستثمرين بالقطامية (عقد ٣٧) .

الشركة المنفذة :
شركة كونكورد للهندسة والمقاولات

تاريخ النهو : ٢٣/٠٣/٢٠١٧

قيمة العقد ٦٤ مليون جنية بالاضافه الى
العقد السابق بقيمه ٣٣ مليون

تاريخ البدء : ٢٣/٠٣/٢٠١٥


•كثرة المرافق كابلات الكهرباء بشارع البساتين
العمومي ورفض شركة الكهرباء تحديد الكابلات
الملغاه وتحويل الكابلات المعترضه مناطق الغرف

•رفض الغاز تحويل خط غاز يعترض الغرف
بشارع الغفارى

خط انحدار صرف صحى قطر ١٢٠٠ مم
وخط طرد قطر ١٠٠٠ مم
بطول ١١.٠ كم

نسبة التنفيذ : ٥٦ %


مشروع الصرف الصحي لمنطقة المستثمرين بالمقطم

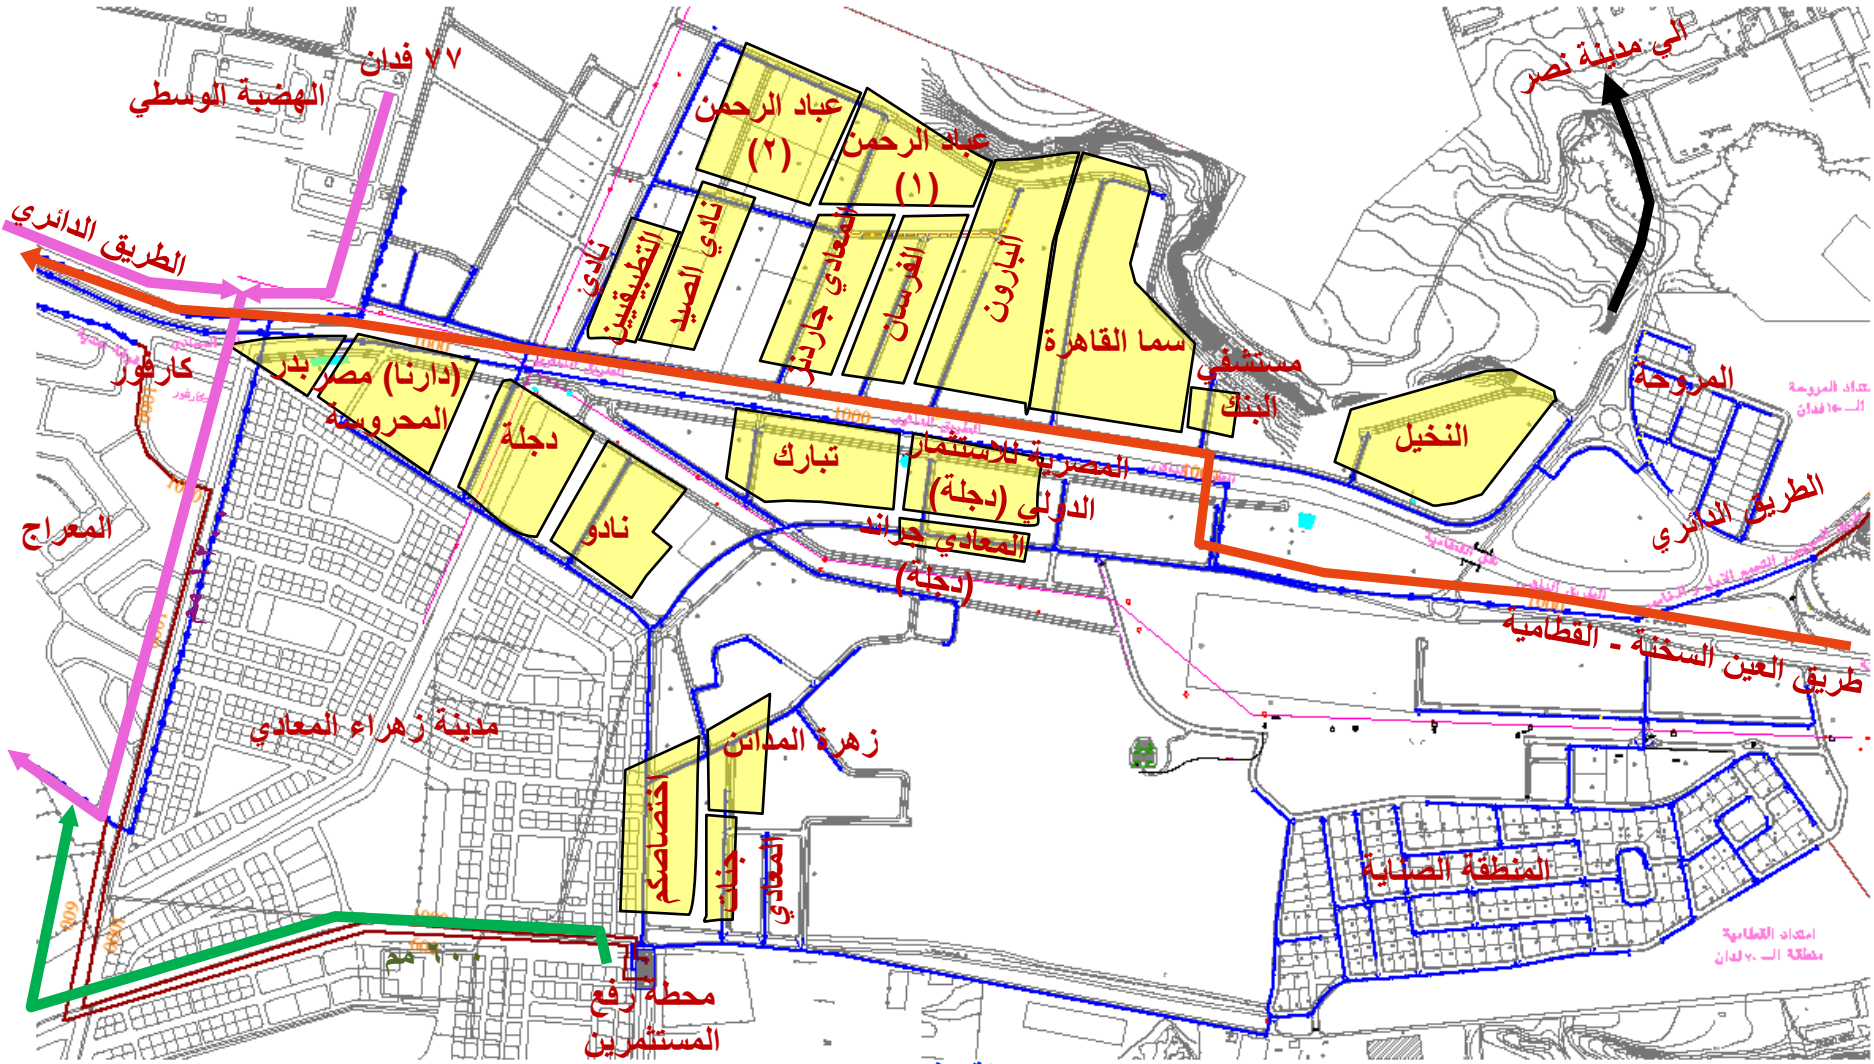

مجمع ١٠٠٠ مم يخدم محطة رفع القاهرة الجديدة
 خط طرد ٦٠٠ مم مؤقت
 مجمع رئيسي ١٢٠٠ مم



مسار المجمع الرئيسي لخدمة منطقة المستثمرين بالقطامية

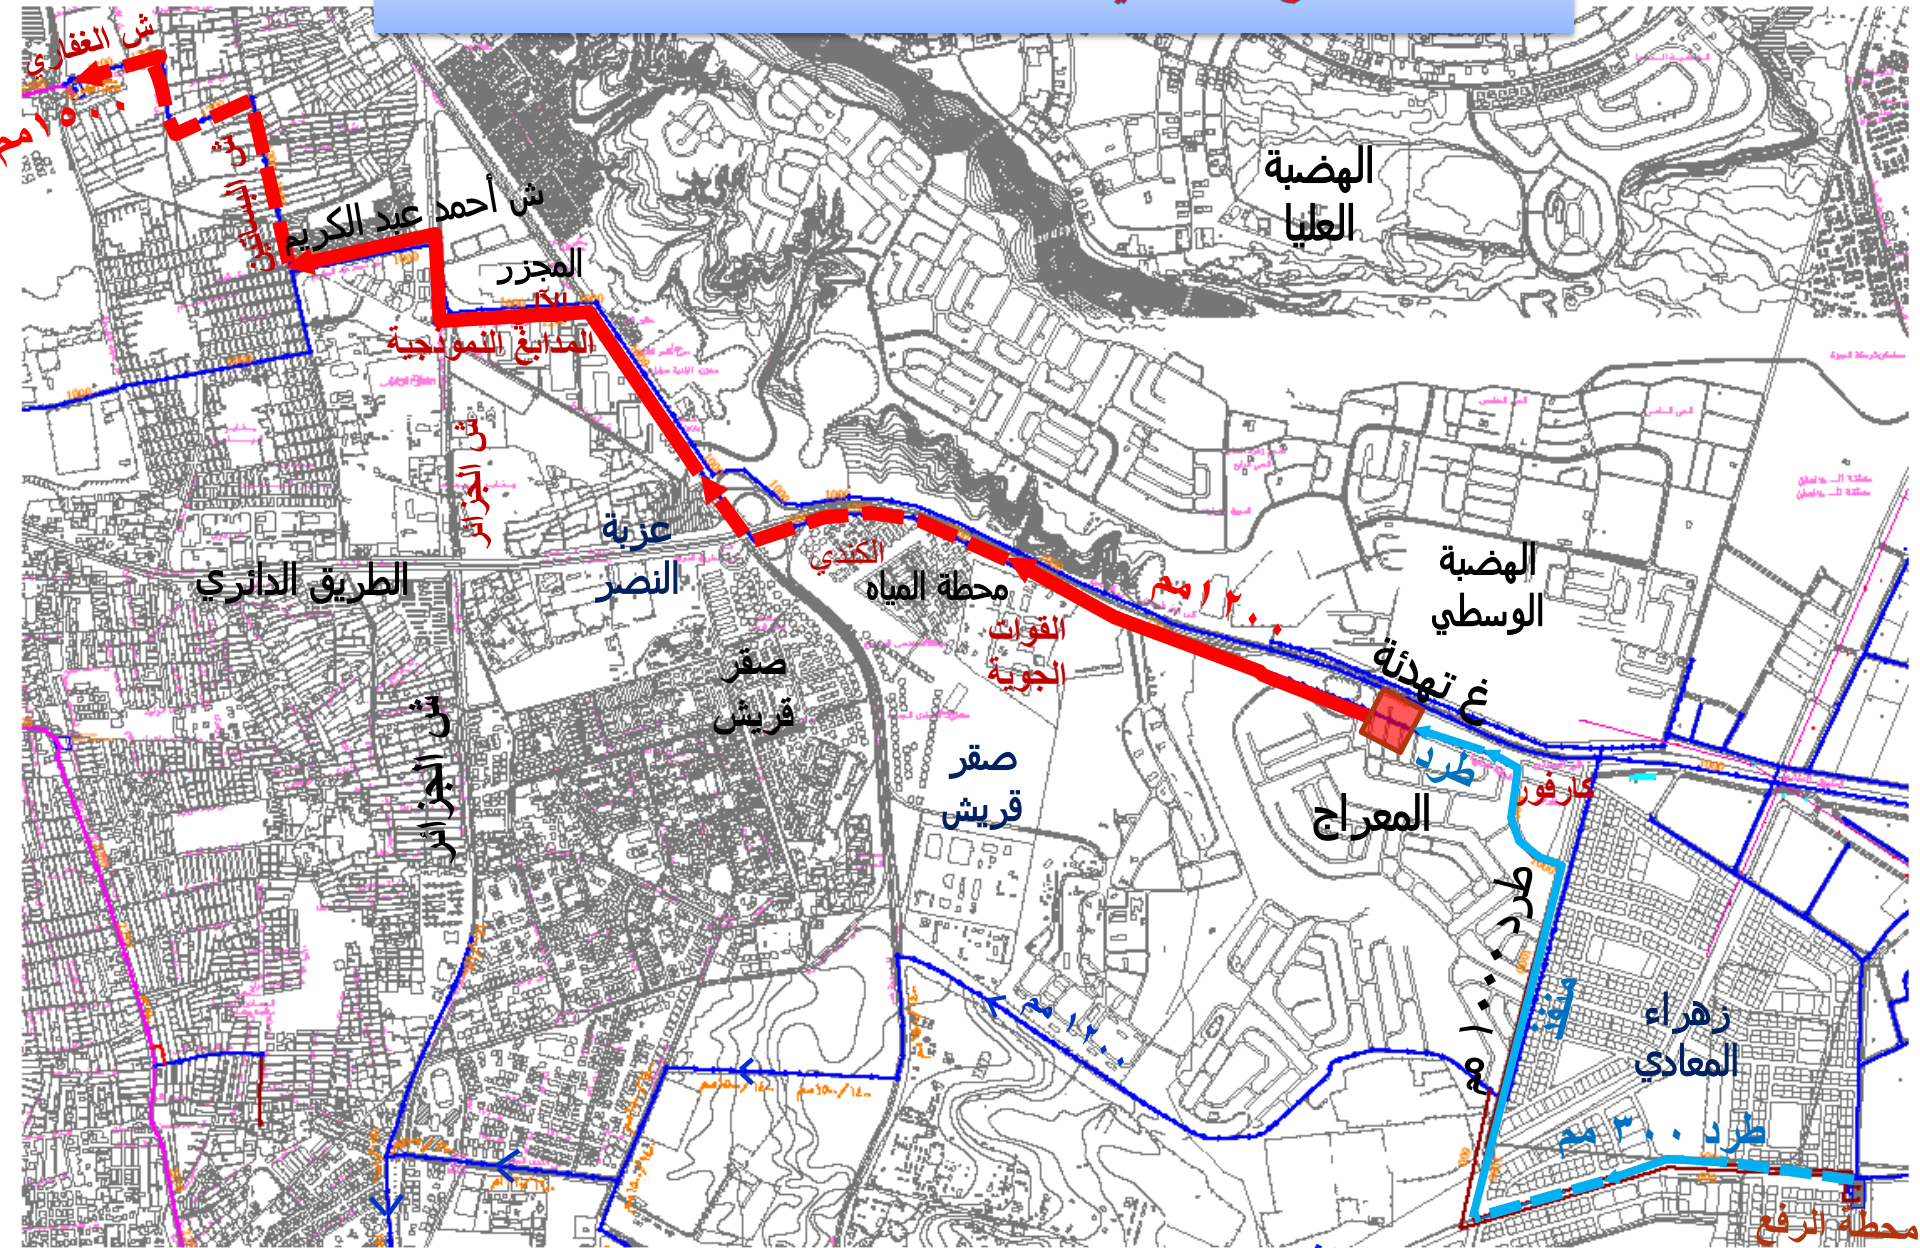

منفذ
غير منفذ







مشروع توصيل الصرف الصحي لمنطقة الصناعات الحرفية لتطوير منطقة بطن البقر (عقد ٣٨) .

الشركة المنفذة :
الطوخي والاسمر وسيد احمد عثمان

قيمة العقد ٣.٩٧٣ مليون جنية

تاريخ النهو : ٢٠١٥/١٢/٣٠


تاريخ البدء : ٢٠٠٧/٠٧/١٤

اثناء رصف المشروع قام مقاول الطرق بتكسير
الاعطية والشنابر والوصلات المنزلية مع الردم
الكامل للمطابق وغرف التفتيش
مطلوب
عمل اجتماع مع مديرية الطرق بالمحافظة لتحديد
الاضرار وكيفية حلها

* محطة رفع صرف صحي قطر ٩ م
١٠٠%
* خط طرد قطر ١٢" بطول ١.٢ كم
١٠٠%
* خط انحدار قطر ٩" ، ١٢ بطول ٢ كم
٨٠%

نسبة التنفيذ : ٨٥%

موقع عام

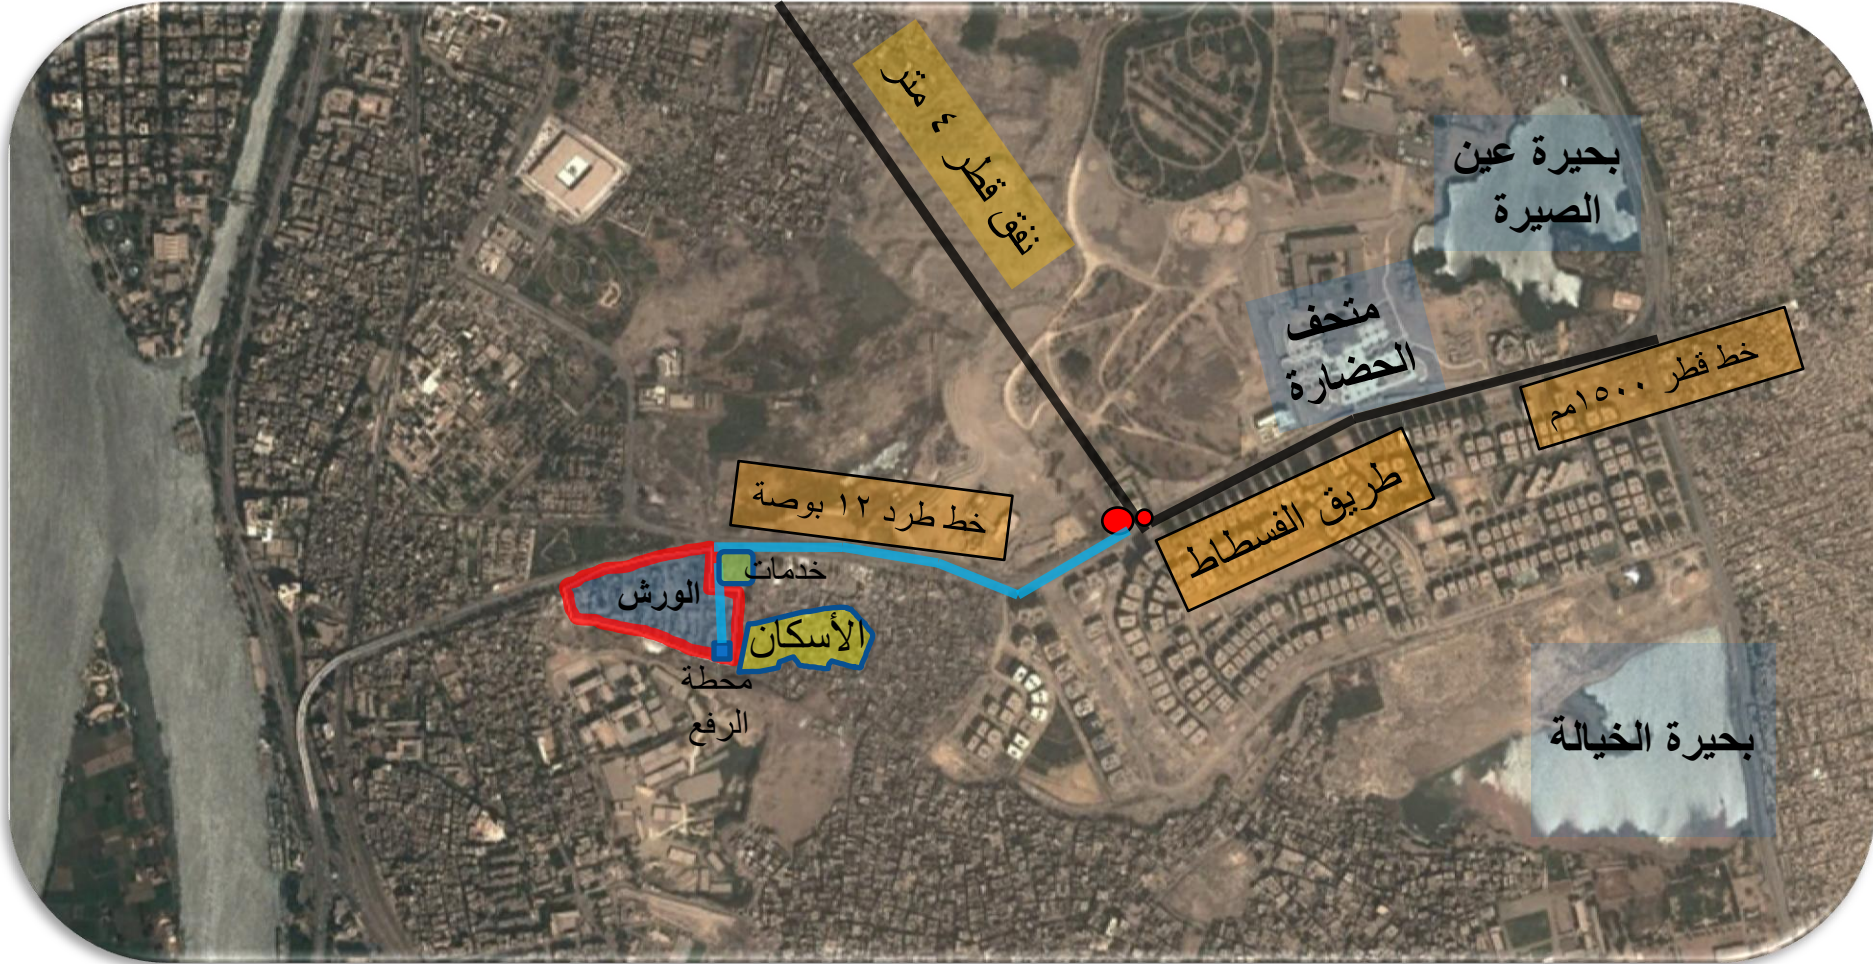

منطقة الورش















نشكركم على حسن الاستماع

مهندس / منصور بدوي ابراهيم
